


UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
ESCUELA DE POSGRADO



T E S I S

**Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras
públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024**

Para optar el grado académico de Maestro en:

Ciencias de la Administración

Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local

Autor:


Bach. Katherine Estefany ESPINOZA MENDOZA

Asesor:

Dr. Cesar Wenceslao RAMOS INGA

Cerro de Pasco – Perú – 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
ESCUELA DE POSGRADO



T E S I S

**Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras
públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024**

Sustentada y aprobada ante los miembros del jurado:

Dra. Yolanda Virginia LLANOS ROMERO
PRESIDENTE

Dr. Liborio ROJAS VICTORIO
MIEMBRO

Mag. Hector Joel PIZARRO RIOS
MIEMBRO



Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Escuela de Posgrado
Unidad de Investigación

INFORME DE ORIGINALIDAD N° 184-2025- DI-EPG-UNDAC

La Unidad de Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, ha realizado el análisis con exclusiones en el Software Turnitin Similarity, que a continuación se detalla:

Presentado por:
Katherine Estefany ESPINOZA MENDOZA

Escuela de Posgrado:
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, CON MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL

Tipo de trabajo:
TESIS

TÍTULO DEL TRABAJO:
“GESTIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU RELACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO – 2024”

ASESOR (A): Dr. Cesar Wenceslao RAMOS INGA

Índice de Similitud:
20%

Calificativo
APROBADO

Se adjunta al presente el informe y el reporte de evaluación del software similitud.

Cerro de Pasco, 05 de noviembre del 2025



Firmado digitalmente por BALDEON
DIEGO Jheysen Luis FAU
20154605046 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.11.2025 12:15:57 -05:00

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Dr. Jheysen Luis BALDEON DIEGO
DIRECTOR

DEDICATORIA

Dedico esta tesis con profundo amor y gratitud a mis padres, quienes han sido el pilar fundamental de mi vida. Su apoyo incondicional, sabios consejos y paciencia infinita han sido esenciales en cada paso de mi camino; todo lo que soy se lo debo a ellos.

A mis hermanos, quienes no solo comparten conmigo lazos de sangre, sino también una amistad sincera y una compañía inigualable en cada etapa de la vida.

Y a toda mi familia, el mayor tesoro que Dios me ha concedido, por ser fuente constante de amor, inspiración y fortaleza.

Katherine Estefany Espinoza Mendoza

AGRADECIMIENTO

Principalmente agradecer a Dios por la fortaleza que me brinda.

A la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y equipo que lo conforman, como los catedráticos, profesionales calificados, porque ellos aportaron en mi grandes conocimientos y experiencias.

AL Dr. Cesar Ramos Inga por ser guía en la elaboración de este presente proyecto.

Katherine Estefany Espinoza Mendoza

RESUMEN

El trabajo de investigación está intitulado “Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024” el objetivo es establecer la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024. El problema identificado es: ¿Como es la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024?, en el análisis relacionamos las variables la gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras públicas. En realidad, busca determinar el nivel de significancia y el nivel correlacional entre estas variables y sus dimensiones para determinar el grado de relación. La población constituye por 259 colaboradores del Gobierno Regional de Pasco de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP). La muestra es de tipo probabilística representado por 156 colaboradores. Se manipuló la técnica de encuesta para la recolección de datos durante la investigación. El instrumento manejado es el cuestionario.

El método y técnica empleado es el enfoque cuantitativo correlacional, el cual permitió estudiar la realidad de gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras públicas. la variable gestión de contrataciones públicas, se obtuvo el siguiente resultado: el 39% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, están en el nivel proceso, entre tanto el 34% están en el nivel inicio, mientras que el 28% en el nivel logrado de muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Palabras claves: Contrataciones del estado, cumplimiento de obras públicas,

ABSTRACT

The research work is titled “State Procurement Management and Its Relationship with the Fulfillment of Public Works in the Regional Government of Pasco – 2024.” The objective is to establish the relationship between state procurement management and the fulfillment of public works in the Regional Government of Pasco in 2024. The identified problem is: What is the relationship between state procurement management and the fulfillment of public works in the Regional Government of Pasco in 2024? In the analysis, we relate the variables: state procurement management and fulfillment of public works. The study seeks to determine the level of significance and the correlational level between these variables and their dimensions to establish the degree of relationship. The population consists of 259 employees of the Regional Government of Pasco, according to the Personnel Allocation Chart (CAP). The sample is probabilistic, represented by 156 employees. The survey technique was used for data collection during the research. The instrument used was a questionnaire.

The method and technique employed follow a correlational quantitative approach, which allowed for the study of the reality of the state procurement management strategy and the variable fulfillment of public works. Regarding the variable state procurement management, the following result was obtained: 39% of the employees surveyed in the Regional Government of Pasco are at the "process" level, 34% are at the "initial" level, and 28% are at the "achieved" level, based on a sample of 156 observations in the study “State Procurement Management and Its Relationship with the Fulfillment of Public Works in the Regional Government of Pasco – 2024.” Therefore, it is concluded that the majority are at the "process" level.

Keywords: State procurement, fulfillment of public works

INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo económico y social de las regiones del país, la adecuada gestión de las contrataciones del Estado se convierte en un elemento clave para garantizar la eficiencia del gasto público y la ejecución oportuna de proyectos de inversión, en particular, de obras públicas. Las contrataciones estatales no solo representan un mecanismo para adquirir bienes y servicios, sino que constituyen una herramienta estratégica para materializar políticas públicas, impulsar el crecimiento territorial y mejorar la calidad de vida de la población.

En este contexto, el presente trabajo de investigación se centra en analizar la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco durante el año 2024. La evidencia empírica demuestra que deficiencias en los procesos de contratación, tales como demoras administrativas, falta de planificación, o debilidades en la supervisión, repercuten negativamente en la ejecución de obras, generando retrasos, sobrecostos o incluso paralización de proyectos.

Desde un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, la investigación busca identificar el grado de relación entre las dimensiones de la gestión de contrataciones (planificación, selección, ejecución y control) y los niveles de cumplimiento de obras públicas, en términos de tiempo, costo y calidad. Asimismo, se espera que los hallazgos permitan formular recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos de contratación en el ámbito regional, contribuyendo así a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

La pertinencia del estudio radica en la necesidad de optimizar los recursos del Estado y asegurar que las obras planificadas se ejecuten con altos estándares de eficiencia, atendiendo las verdaderas necesidades de la ciudadanía y cumpliendo con los objetivos de desarrollo regional establecidos.

La investigación titulada “Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024”, tiene como objetivo

establecer la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024. Dando como referencia el progreso de los trabajadores en su entorno laboral. El problema central de la investigación es ¿Como es la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024?

En los demás capítulos contiene. En el primer capítulo: se define la problemática, y en el segundo capítulo: está el marco teórico se menciona el contexto del estudio, se conceptualiza las variables como es la gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras públicas, así como sus dimensiones e indicadores, también constreñimos nuestra hipótesis: La gestión de contrataciones del Estado se relaciona con el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

En el siguiente capítulo contiene los argumentos necesarios, comprendiendo el nivel de Investigación, diversidad y método, y representación del territorio. Para esta investigación La población está compuesta por 259 colaboradores del Gobierno Regional de Pasco de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Nuestra muestra representativa está constituida La muestra en la presente investigación será de tipo probabilística 156 colaboradores

Los hallazgos que encontramos respecto a la variable gestión de contrataciones del estado, se obtuvo el siguiente resultado: el 39% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel proceso, entre tanto el 34% están en el nivel inicio, mientras que el 28% en el nivel logrado de muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras en la

Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna. Hay una correlación positiva moderada con un 69% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos el cumplimiento de obras en el gobierno Regional de Pasco – 2024. Forma, la forma de transformación, presentación, análisis e interpretación. Datos; Mientras que el cuarto capítulo contiene los resultados y su discusión. Los resultados, afirmaciones y limitaciones se presentan al final, seguidos de apéndices y referencias notables.

Las herramientas de investigación se validaron con la opinión de 3 expertos en los instrumentos de investigación, así como la fiabilidad se realizó con el coeficiente de alfa de Cronbach.

Al finalizar esta investigación concebimos una gran complacencia profesional y personal por haber ejecutado uno de nuestros sueños. Dejamos a consideración de los señores jurados hacer sus sugerencias profesionales para aumentar, excluir, quitar o enriquecer la presente investigación. Estoy eternamente agradecido a todos los catedráticos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión por su valioso aporte a mi formación profesional.

Katherine Estefany Espinoza Mendoza

ÍNDICE

Página

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Identificación y determinación del problema	1
1.2. Delimitación de la investigación	2
1.2.1. Delimitación espacial:	2
1.2.2. Delimitación temporal:	3
1.2.3. Delimitación social: (Unidad de análisis).....	3
1.2.4. Delimitación conceptual.	3
1.3. Formulación del problema.....	3
1.3.1. Problema general	3
1.3.2. Problemas específicos.....	3
1.4. Formulación de objetivos	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Justificación de la investigación	4
1.5.1. Justificación teórica	5
1.5.2. Justificación metodológica	5

1.5.3. Justificación practica	6
1.6. Limitaciones de la investigación	6

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de estudio	7
2.1.1. Antecedentes internacionales	7
2.1.2. Antecedentes nacionales	10
2.2. Bases teóricas - científicas.....	12
2.2.1. Conceptualización de la variable gestión de contratación del estado.....	12
2.2.2. Conceptualización de la variable culminación obras públicas	16
2.3. Definición de términos básicos	22
2.4. Formulación de hipótesis.....	24
2.4.1. Hipótesis general	24
2.4.2. Hipótesis específica	24
2.5. Identificación de variables.....	24
2.6. Definición operacional de variables e indicadores	28

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación	30
3.2. Nivel de investigación	30
3.3. Métodos de investigación	31
3.4. Diseño de investigación.....	31
3.5. Población y muestra	32
3.5.1. Población	32
3.5.2. Muestra	32

3.6. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos.....	33
3.6.1. Técnica.....	34
3.6.2. Instrumentos	34
3.6.3. Recolección de datos	34
3.7. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación.....	35
3.7.1. Validad de los instrumentos de investigación	35
3.7.2. Confiabilidad de los instrumentos de investigación	36
3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....	38
3.9. Tratamiento estadístico.....	40
3.10. Orientación ética, filosófica y epistémica	40

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Descripción del trabajo de campo	42
4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados.....	43
4.2.1. Variable 1 gestión de contrataciones públicas.....	44
4.2.2. Variable 2 Variable Cumplimiento de obras	50
4.3. Prueba de hipótesis.....	54
4.3.1. Contratación de Hipótesis	58
4.4. Discusión de resultados	68

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Gestión de contrataciones públicas	44
Tabla 2 Dimensión Planificación.....	45
Tabla 3 Dimensión marco normativo.....	46
Tabla 4 Dimensión proceso de selección.....	47
Tabla 5 Dimensión ejecución contractual.....	48
Tabla 6 Dimensión tecnológica.....	49
Tabla 7 Variable2 cumplimiento de obras	50
Tabla 8 Dimensión ejecución contractual.....	51
Tabla 9 Dimensión garantía de adelanto.....	52
Tabla 10 Dimensión incumplimiento de contrato.....	53
Tabla 11 Dimensión culminación de ejecución	54
Tabla 12 Prueba de normalidad para las variables.....	56
Tabla 13 Prueba de Kolgomorov – Smirnov para cada dimensión.....	56
Tabla 14 Tabla Coeficiente de correlación de Spearman	58
Tabla 15 Correlación de las variables Gestión de contratación y cumplimiento de obras ...	59
Tabla 16 Correlación de Gestión de contratación con la dimensión ejecución contractual .	61
Tabla 17 Correlación de Gestión de contratación con la dimensión garantías de adelanto..	63
Tabla 18 Correlación de Gestión de contratación con la dimensión incumplimiento de contratato.....	65
Tabla 19 Correlación de Gestión de contratación con la dimensión culminación de contrato	67

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Género varón y mujer	43
Gráfico 2 Gestión de contrataciones públicas	44
Gráfico 3 Dimensión planificación	45
Gráfico 3 Dimensión marco normativo	46
Gráfico 5 Dimensión proceso de selección	47
Gráfico 6 Dimensión ejecución contractual	48
Gráfico 7 Dimensión tecnológica	49
Gráfico 8 Variable 2 cumplimiento de obras públicas	50
Gráfico 9 Dimensión ejecución contractual	51
Gráfico 10 Dimensión garantías de adelanto	52
Gráfico 11 Dimensión incumplimiento de contrato	53
Gráfico 12 Dimensión culminación de ejecución	54
Gráfico 13 Correlación de gestión de contratación pública y cumplimiento de obras	60
Gráfico 14 Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión ejecución contractual	62
Gráfico 15 Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión garantía de adelanto	64
Gráfico 16 Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión incumplimiento de contrato	66
Gráfico 17 Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión culminación de la ejecución contractual	68

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1 Gestión de contratación del estado	14
Figura 2 Contratos del sector público	19
Figura 3 Procedimientos de selección	22
Figura 4 Validación por expertos.....	36
Figura 5 Reactivos de gestión de contratación pública.....	37
Figura 6 Reactivos de Gestión de contratación pública.....	37
Figura 7 Reactivos de cumplimiento de obra	37
Figura 8 Valor de alfa de Cronbach.....	38
Figura 9 Estadística de fiabilidad alfa de Cronbrach.....	38
Figura 10 Baremos con variables y dimensiones.....	39
Figura 11 Baremo de gestión de contrataciones y cumplimiento de obras	39

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Identificación y determinación del problema

(Ley N° 31535 modifica Ley 30225, 2022) La contratación con el Estado peruano es un proceso complejo y presenta una serie de vacíos regulatorios y modelos institucionales que favorecen la aparición de actos de corrupción. El Estado peruano no cuenta con un sistema centralizado que gestione todos los procesos involucrados en las compras públicas. En este contexto, para llevar a cabo una contratación pública efectiva es necesaria la participación de once sistemas administrativos del Estado peruano. De conformidad con la ley orgánica del poder ejecutivo, ley n°. 29158, cada uno de estos sistemas administrativos tiene un órgano rector. En otras palabras, desde una perspectiva administrativa, la jerarquía que controla el funcionamiento de los sistemas administrativos no depende de la entidad pública donde se implementa.

(Revilla, 2021) En el Perú, las compras públicas representan la mayor parte del gasto gobierno un impresionante 50,7% y 11,6% del PIB, lo que está en línea con el promedio de la OCDE; Esto demuestra lo trascendente que es una contratación pública para la economía y la sociedad del país.

(Montenegro, 2022) respecto a los niveles creada por el gobierno regional para el gobierno local, representa una concentración del 58% del presupuesto y, además, un mayor incremento en ejecución en 2021, de 46% a 64% de avance; Sin embargo, los niveles establecidos por el estado requieren un exceso del 71.4% en gobiernos nacionales y 71% en la región. As, "A finales de diciembre, 64 de ellos no presentaron ningún adelanta tu presupuesto de S/52 millones; Por su parte, Chavimochic III registró una ejecución de sólo el 15,9% de los 20 millones de S/20 asignados para 2021.

(Pérez, 2022) Cabe señalar también que en el marco del presupuesto de apertura institucional, se aprueba al final de cada año en diciembre y según lo determine Plan anual de adquisiciones, presupuesto asignado por adelantado días del mes de enero del nuevo ejercicio económico; La razón por la cual no puede ser Planificado oportunamente un presupuesto anual preciso de la obra; provocando la no realización financiera de determinados proyectos y en consecuencia informes funciona año tras año. Al respecto, de lo expuesto se desprende la siguiente pregunta: ¿Como es la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024?

1.2. Delimitación de la investigación

De acuerdo con la problemática encontrada la investigación metodológicamente en la delimitación espacial es todo el Gobierno Regional de Pasco, como institución pública. Mientras que la delimitación temporal comprende los meses de febrero a julio del año 2024. La delimitación social se incluye a todo el personal administrativo como los Gerentes y profesionales, técnicos y auxiliares del Gobierno Regional de Pasco.

1.2.1. Delimitación espacial:

En nuestra investigación se realizó dentro del gobierno regional de Pasco

1.2.2. Delimitación temporal:

Se concluyó el trabajo de investigación desde el 17 de agosto del 2024 hasta el 21 de enero de 2025

1.2.3. Delimitación social: (Unidad de análisis)

Está comprendido todos los empleados administrativos del gobierno regional de Pasco.

1.2.4. Delimitación conceptual.

Gestión de contrataciones del Estado Se entiende por gestión de contratos el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el adecuado funcionamiento de la gestión de los contratos estatales y el uso del conocimiento. Asimismo, se refiere a las tareas y comprar suministros con uso de fondos o recursos Se han completado obras públicas obligatorio por contrato y oferta, y además compra o transferencia de productos (Martínez Zamora, 2022).

Cumplimiento de obras públicas Esta es la secuencia lógica de actividades constructivas que son fabricados en un periodo determinado ejecuciones; que incluye solo artículos de presupuesto del expediente técnico, y también enlaces posibles preséntate (Normas legales diario El Peruano 2022)

1.3. Formulación del problema

El problema general acotado para el presente trabajo de investigación es:

1.3.1. Problema general

¿Como es la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024?

1.3.2. Problemas específicos

- a) ¿Cómo es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024?

- b) ¿Cuál es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024?
- c) ¿Cómo es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024?
- d) ¿Cómo es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024?

1.4. Formulación de objetivos

Los objetivos de la presente investigación tienen como propósito los siguiente

1.4.1. Objetivo general

Establecer la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

1.4.2. Objetivos específicos

- a) Determinar la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.
- b) Establecer la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024.
- c) Establecer la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024.
- d) Determinar la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

1.5. Justificación de la investigación

Debido a las falencias en la gestión de los contratos estatales por parte de las instituciones públicas, se hace necesario dar solución a esta importante problemática y

ser un servidor que gestione la gestión de los contratos estatales y la ejecución de las obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024; estar en directo Contacto con los ciudadanos sobre la calidad de los productos e intervenciones de mejora tanto en la compra de bienes como de servicios. Este estudio es importante, porque servirá de base para otros estudios similares.

1.5.1. Justificación teórica

Al hacer una revisión del corpus teórico, puede identificar los principales modelos y modelos existentes, evaluar su relevancia y pertinencia para el trabajo de investigación y determinar si existen lagunas en el conocimiento actual que la investigación pueda llenar. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que los resultados obtenidos pueden requerir una interpretación cuidadosa y crítica para evitar conclusiones erróneas. En este estudio pretendemos enriquecer el contexto teórico respecto a nuestra variable de control interno y ejecución presupuestaria para permitir un análisis.

1.5.2. Justificación metodológica

La razón metodológica de esta investigación es el enriquecimiento del corpus teórico, a través de un análisis riguroso y razonado de la relación entre las variables de la gestión de las compras públicas estatales y la ejecución de las obras públicas en el Gobierno Regional Pasco 2024, para verificar o rechazar los Aspectos teóricos sobre este tema.

Determinar el grado de asociación entre las variables estudiadas es un paso fundamental en el estudio, porque esto nos permite determinar si existe una relación significativa entre ellos y, de ser así, la dirección y la fuerza de esa relación.

Los resultados de la investigación también validarán las técnicas de investigación utilizadas, que son necesarias para asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Es necesario destacar que el logro de estos objetivos requiere la utilización de métodos y técnicas adecuadas para la recolección y análisis de datos, así como una interpretación rigurosa y cuidadosa de los resultados obtenidos.

1.5.3. Justificación practica

Los resultados de la investigación propuesta tendrán implicaciones prácticas para la solución de los problemas de los tomadores de decisiones relacionados con la gestión de los contratos estatales y la ejecución de obras públicas. Al identificar las relaciones entre estas variables, se pueden desarrollar estrategias y políticas para mejorar la gestión pública de las instituciones públicas.

Es importante señalar que la investigación postdoctoral sigue un enfoque práctico y se aplica con el objetivo de generar conocimiento que pueda utilizarse para resolver problemas existentes en el mundo real. La investigación debe apuntar a encontrar soluciones prácticas y sostenibles a los problemas y desafíos que enfrentan las organizaciones y la sociedad en general.

1.6. Limitaciones de la investigación

Las restricciones son generalmente de naturaleza económica. Si queremos abarcar un estudio más amplio, prima el factor económico. Otra limitación que podemos destacar es muchas veces el incumplimiento de algunos directivos o empleados de someterse a nuestras herramientas de evaluación por temor a represalias o preguntas por parte del empleador.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de estudio

A continuación, expondremos las investigaciones que anteceden a nuestro trabajo de investigación.

2.1.1. Antecedentes internacionales

Márquez, (2023) en el artículo científico intitulado Estudio del sistema de compras públicas en Chile: Evolución y perspectiva de compradores perteneciente a la Universidad de Chile maestría en gestión y políticas públicas llega a la siguiente conclusión: “El levantamiento del sistema de compras y contrataciones públicas Chile (Chile-Compra) es una de las respuestas a la salida política de uno de las crisis institucionales más importantes de la década de 2000, generadas por actos de corrupción por parte de altos funcionarios del sector de la construcción público. A pesar de un proyecto de ley que crea un mecanismo Se registraron ante la Cámara de Comercio 4.444 contrataciones públicas reguladas. Diputados de la época por Mensaje presidencial, en octubre 1999, recibió atención prioritaria sólo desde enero de 2003, cuando se firmó el acuerdo político entre el gobierno del presidente Ricardo Lagos y la

oposición de la época, representada por partidos de derecha agrupados en coalición, se convirtió en ley de la República en julio de 2003. Se puede concluir que ni la autoridad en el cargo ni la misma institucionalidad, dando valor a los mercados públicos, como proceso estratégico y fuente de desarrollo. Chile-Compra ha negociado temas relevantes relacionados con la evolución del proceso de compras público, pasando de lograr objetivos primarios a generar objetivos secundarios Cambios y modernización desde una perspectiva de planificación estratégico e innovador, la prueba es cierta Proceso revisados en este documento, como la inclusión de las mujeres, interoperabilidad y avances en la nueva forma de acreditación”. (p. 179)

Preciado et al., (2023) en la tesis intitulada Cultura de la corrupción en las contrataciones públicas entre empresas multinacionales y el estado colombiano en el periodo 2015-2023, de la Universidad Pontificia Bolivariana escuela de administración, economía y negocios internacionales de Medellín Colombia arribaron a la siguiente conclusión: “La cultura de la corrupción en Colombia está presente en las interacciones entre ellos. El Estado y el sector privado, especialmente en los contratos para la ejecución de 4.444 programas y/o proyectos, como lo demuestran los casos Odebrecht y REFICAR, en los que los sobornos y la falta de control provocaron al Estado colombiano pérdidas por varios millones de euros. Estas pérdidas para el Estado se reflejan en las pérdidas patrimoniales ocasionadas por casos como el de REFINE que los retrasos en este proyecto han causado esto. El país dejará de recibir ingresos por exportaciones de crudo, por su parte en este caso. Los retrasos de Odebrecht en obras de infraestructura han generado una caída. El proceso de desarrollo de Colombia afectará directamente su infraestructura vial. Siempre cuando estos casos se identifican, denuncian y sancionan, estos comportamientos pueden ser. La falta de disposiciones legales aplicables a la evaluación de proyectos facilita situaciones y actos de

corrupción. Esta falta de evaluación también crea una brecha entre lo que se debe hacer y lo que se hace, esta brecha se da a funcionarios y organizaciones un campo de acción en el que son libres de actuar. De esta manera se eliminan todas las brechas que existen entre el desarrollo del proyecto y su evaluación. Los últimos son los espacios en que existe corrupción. La corrupción va en aumento en Colombia ser parte de la cultura, de ahí viene el nombre de cultura de la corrupción, porque es una conducta aceptada y en aquellos ámbitos donde hay falta de ley, esta conducta logra darse, causando daños considerables. bienes patrimoniales de la nación como lo demuestra el caso REFICAR o los efectos sobre La infraestructura nacional demostrada por Odebrecht”. (pp. 33-34)

Meyer & Fath, (2022) en la investigación intitulada Evaluación de las contrataciones públicas en Chile, en la revista científica reforma del estado volumen II, llega a las siguientes conclusiones: “El propósito de este estudio es estimular la discusión y el debate presentando impresiones y evaluaciones iniciales respecto de la reforma de la contratación pública. Creemos que esta evaluación puede contribuir al debate que se está desarrollando. La ley se ha acelerado desde la introducción de un proyecto de ley destinado a modernizar el sistema de compras públicas. Consideramos que este proyecto (desde 1999) no tiene en cuenta el potencial del tema y no logra los objetivos sólidos para los cuales fue creado. Pizarra. Este estudio no constituye un estudio exhaustivo de las entidades contratantes en Chile. En octubre de 1999, los autores realizaron una veintena de entrevistas en Chile. Se entrevistó a funcionarios que actualmente realizan reclutamiento para agencias del gobierno central. Por lo general, entre uno y tres funcionarios representan a su institución, departamento o unidad. También se mantuvieron reuniones con representantes de instituciones clave que juegan un papel importante. papel en el proceso de compras públicas en Chile. Tanto la Contraloría General de la República, el Comité Interministerial para la Modernización

de la Gestión Pública (hoy Comité de Ministros para la Reforma del Estado) como el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno General (CAIGG) han brindado información muy esclarecedora. (p. 546)

2.1.2. Antecedentes nacionales

Gutierrez, (2023) en la tesis para obtener el grado académico de maestro titulado Contrataciones del estado y su influencia en el cumplimiento de obras públicas de una Municipalidad Provincial de La Libertad, año 2022, de la Universidad César Vallejo programa académico de maestría en gestión pública concluye: Se demostró, mediante la prueba no paramétrica Chi-cuadrado, que la correlación entre las variables estudiadas fue significativa, arrojando un valor de 0,000; lo que determina que existe una afectación a los contratos estatales con la finalización de las obras públicas de un municipio provincial de La Libertad, con una relación lineal de 56,2%. Se ha demostrado que a través de la prueba no paramétrica Chi-cuadrado, la correlación es significativa entre el tamaño de acciones preparatorias y ejecución del contrato, elevando el valor a 0,000; lo que determina que la regulación actual para la contratación de proveedores es la forma idónea para contratar con los proveedores de obra pública del municipio, con una relación lineal de 61.4%. Se ha demostrado que a través de la prueba no paramétrica Chi-cuadrado, la correlación es significativa entre los métodos de contratación y el tamaño de la ejecución contractual, lo que arroja un valor. desde 0.000; lo que determina que contratos estatales vigentes cumplen los plazos procesales para la ejecución de su presupuesto en el municipio, con una relación lineal del 60,2%". (p. 65)

Jayta & Rodriguez, (2024) tesis para obtener el grado académico de maestro intitulado Contrataciones públicas y obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa - periodo 2022-2023, de la

Universidad Continental maestría en gerencia pública, llegó a las siguientes conclusiones: “Explicar la relación entre los puestos de administración directa y la transparencia en la municipalidad del distrito de Miraflores, Arequipa – periodo 2022-2023, se evidenció una relación significativa, ya que Rho y Rango de Spearman de 0,811 y nivel de significancia de $p = 0,000$; En este sentido, de acuerdo a lo expresado por los trabajadores que participaron en esta encuesta, La transparencia es un factor importante en la labor de la administración directa, desde Si no se proporciona o se proporciona incorrectamente, afecta el trabajo que realiza el municipio. Miraflores, Arequipa. Analizar la relación entre las obras de la administración directo y eficiente en la municipalidad del distrito de Miraflores, Arequipa – periodo 2022-2023, se obtuvo un Rho de Spearman de 0,875 con un nivel de importancia de 0,000; Esta relación significativa se obtiene sobre la base de coordinación, la planificación y ejecución de actividades en las diferentes etapas de la obra son en relación a la eficiencia de la ejecución. Además, la coordinación de diferentes áreas y la calidad de la planificación también afectan directamente la implementación oportuna ejecución de la obra y de los trabajadores en cuestión. Establecimiento de relaciones entre obras por parte de la administración directivas y reglamentos en el municipio Distrito de Miraflores, Arequipa – periodo 2022-2023, se obtuvo un Rho de Spearman de 0,859 con un nivel de significancia de 0,000 indicando que la implementación efectiva de las regulaciones (Mamani & Barrientos, 2023)afecta directamente la ejecución de obras por la administración directa”. (p. 69)

Mamani & Barrientos, (2023) trabajo de investigación para obtener el título profesional titulado Contrataciones del estado para adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 UIT, Municipalidad Distrital de Pisac, 2022 de la Universidad Continental de la escuela académica profesional de contabilidad llegó a las siguientes

conclusiones: “Las demandas de la municipalidad de Pisac se cumplen sin escrúpulos. ineficaz, por ser evidente que las especificaciones técnicas y/o condiciones de las referencias realizadas por los espacios de usuario no siempre cumplen los requisitos previstos en la directiva interna que rige el ámbito de la logística, donde el 4% se cumple parcialmente, este factor puede generar retrasos en la atención de los Bienes y/o del Servicio y, por ende, no alcanzar objetivos y metas. establecidos por la entidad y no habría una adecuada ejecución de los gastos presupuesto, y esto significaría que la empresa no estaba completamente satisfecha gestión. También se ha identificado que existen requisitos respecto de una fianza para la cual Se realizaron ofertas por un solo proveedor en diferentes envíos, esto nos da indicios que podría ser una división, que la ley de contratos sanciona entidades que realizan este tipo de compras, es decir Esto se refleja en las solicitudes de proyectos de inversión. En las citas podemos ver que hay un desequilibrio entre los precios unitarios en comparación con el precio de mercado, y que no registran las fechas de entrega de los bienes o servicios para el cumplimiento de la entrega. La tabla comparativa es un resumen de todas las cotizaciones realizadas para Comparación de precios y determinación o adjudicación del contrato al mejor postor. El resultado de podemos comparar Tenga en cuenta que el 10% es parcialmente consistente, esto se debe a que la tabla de comparación no refleja los mismos montos mostrados en las cotizaciones”. (p. 65)

2.2. Bases teóricas - científicas

2.2.1. Conceptualización de la variable gestión de contratación del estado

Salazar & Angles, (2020) “En el Estado peruano, el organismo que controla los contratos del estado es OSCE. ¿Quién es la entidad principal responsable del control y garantiza el cumplimiento de las leyes en las contrataciones públicas del Estado peruano? Poseído jerarquía en el espacio territorial, y controla el avance del

reclutamiento bienes, servicios y obras realizados por la organización. La organización es las entidades técnicas especializadas, en el MEF, con personalidad jurídica público y establecer un presupuesto previsto”. (p. 98)

Soria, (2022) al respecto define “El propósito de los contratos gubernamentales es establecer reglas para regir el valor del dinero. del contribuyente en los intercambios que realicen las entidades del sector público, para que se realicen correctamente y con el mejor precio y condiciones calidad a través del respeto a los principios”. (pág. 44)


Reglamento de la Ley N° 30225 Contrataciones del Estado, (2022) dice al respecto “El presente reglamento y sus reglamentos son de derecho público, cuyas normas establece el procedimiento administrativo que está por encima de los de derecho privado, son adecuado. El tribunal de contratación pública es responsable de regular de todas las sanciones vigentes sobre los sujetos de los contratos en cuestión bienes, servicios u obras y no están regulados por esta norma, a menos que la norma requiera La solicitud deberá cubrir las deficiencias que existe en la norma citada. En los contratos estatales se regulan por esta norma y su estatuto, así como por aquellas Para este propósito se escribieron Directivas”. (pág. 16)

Zambrano, (2022) “El sistema de compras públicas impulsado en el país en los últimos años tiene como objetivo regular la emisión de compras para garantizar la imparcialidad, transparencia y publicidad en los procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios u obras. Aunque no hay consenso sobre este punto, algunos consideran que estas medidas entran en conflicto con la eficacia y eficiencia de la gestión de la administración pública, privilegiando unos principios sobre otros y no teniendo en cuenta los resultados. “Considerando aspectos importantes de la realidad del mercado peruano”, es importante identificar qué normativa de compras públicas realmente promueve la transparencia en los procesos de selección que realizan las

entidades del sector público. El cuerpo teórico de la investigación es la parte esencial para alcanzar los objetivos de la investigación. A continuación, desglosaremos las variables y dimensiones con los conceptos y definiciones propuestos por diversos los autores. El objetivo de esta norma es limpiar el proceso de selección de todo interés que pueda interferir con los propios de la entidad para solicitar la adquisición de un bien o servicio, o la ejecución de una obra a una persona natural o jurídica independiente de todo vínculo familiar o de autoridad”. (pp. 125 – 126)

Revilla, (2021) “La construcción de un sistema de competencia en nuestro país ha permitido comenzar a sentar las bases para facilitar el control social y reducir parcialmente la corrupción y el sesgo en los procesos de selección de funcionarios estatales a cargo de las contrataciones públicas. Es un camino donde hay mucho por hacer. En todo caso, los avances alcanzados hasta la fecha permiten una mejor observación y seguimiento de los procesos de selección de las entidades públicas. Aunque pueda pasar el caso de las autoridades que buscan formas de promocionar con contratos estatales a familiares, amigos, conocidos o empresas que financian su campaña, hoy esto puede ser mejor monitoreado y controlado por la ciudadanía, el periodismo de investigación y la Contraloría General de la República”. (p. 196)

Figura 1 *Gestión de contratación del estado*

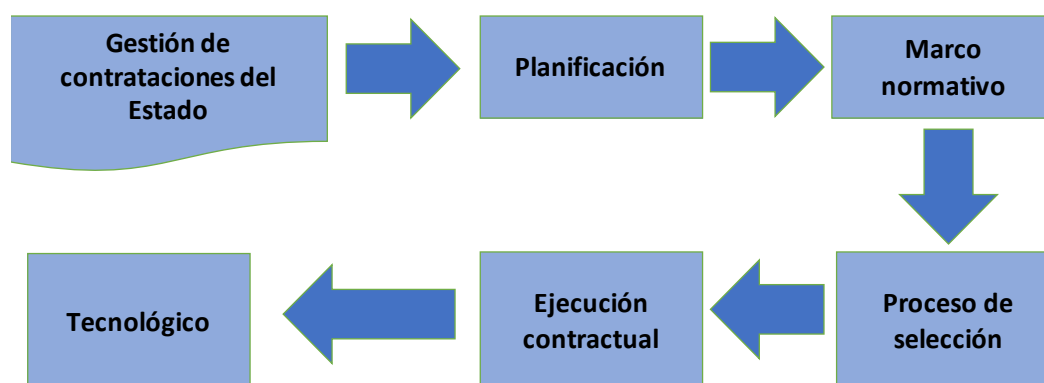

Fuente: (Nuñez & Talavera, 2021)

Dimensiones planificación

Ley N° 31535 modifica Ley 30225, (2022) “Por otra parte, el proceso de contratación pública se menciona en donde toma como primer capítulo la planeación, que según (Diario el Perú, 2019) Artículo 15. El plan anual de abastecimiento determina”.

Artículo 15.1: “Formulación del Plan Anual de Provisiones: Tener en cuenta números la fase de formación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente ejercicio cada entidad deberá programar La tabla de requisitos presenta los requisitos para bienes, servicios y obras necesarios para lograr sus metas y actividades para este, el cual deberá estar vinculado al plan operativo institucional, para la elaboración del Plan Anual contratos”. (Ley N° 31535 modifica Ley 30225, 2022)

Dimensión marco normativo

Antonio & Zamora, (2022) “El marco regulatorio de las compras públicas en el Perú asegura la eficiente adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. El reglamento ofrece directrices a los contribuyentes para impulsar una reforma profunda del sistema de compras públicas. Además, el acuerdo marco constituye una racionalización técnica del contrato que permite la celebración y adjudicación de contratos públicos en las condiciones establecidas por un acuerdo previo. Los sujetos pueden utilizar métodos como: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada o subasta en el marco regulatorio de la contratación pública”. (p. 69)

Dimensión proceso de selección

Becerra, (2020) “El proceso de selección en los contratos gubernamentales es un procedimiento administrativo que se realiza para seleccionar a la persona o entidad que mejor se adapta a las necesidades de la entidad pública. En la fase de selección,

dependiendo del procedimiento de selección utilizado, se podrán realizar los siguientes pasos: Llamada”:

Registro de participantes.

Formular preguntas y observaciones.

Resolución de consultas, observaciones e integración de bases.

Presentación de ofertas.

Aceptación de ofertas.

Dimensión tecnológica

Campos et al., (2022) “La aplicación OSCE y la aplicación RD Contrataciones son aplicaciones que le permiten obtener información sobre los contratos gubernamentales. Asimismo, se utiliza la aplicación OSCE que está disponible para Android e iOS. Fue desarrollado por el Órgano de Supervisión de Contrataciones Públicas (PSSB). Esta aplicación te permite encontrar oportunidades de negocio para contratar con el estado”.

2.2.2. Conceptualización de la variable culminación obras públicas

Taquire, (2023) “La ejecución de obras públicas a través de la gestión de obras públicas tiene como finalidad el cumplimiento del fin público, que es procurar el bien común de sus integrantes a través de los bienes, servicios y obras que el Estado realiza para beneficio de la población, tales como: inversiones en educación, salud, seguridad, etc. Además, para lograr la satisfacción del interés público, se implementa un enfoque basado en la gestión por resultados, que permitirá la medición de los objetivos establecidos, para cada ministerio”.

Gestión de obras públicas con administración directa Según Gorbaneff et al., (2023) y la Agencia de Supervisión de la Contratación Pública: “La entidad, con sus recursos y personal, prepara directamente hojas de datos técnicos. Esta acción se

realizará a través de sus campos de estudio o proyectos, que requieren que la Entidad cuente con profesionales especializados, infraestructura, recurso humano y logística para activarlos. En este caso, la responsabilidad de Su preparación está a cargo del funcionario designado para tal efecto. Este tipo de gestión es realizada por una misma entidad, es decir, por funcionarios de los diversos campos en cuestión, para lo cual deben contar con capacidades técnicas y disponibilidad presupuestaria”. (p. 87)

Gestión de obras públicas por contrato Según el Órgano Estatal de Control de las Contrataciones Públicas (2011): Son los procedimientos necesarios para la ejecución de obras en el marco de procedimientos de licitación. o llave en mano, porque permiten contratos conjuntos para el desarrollo del expediente técnico y la ejecución de la obra. La ejecución se realiza por una entidad distinta a la especificada en el contrato, privada o pública, a título oneroso o gratuito, que haya sido seleccionada mediante concurso o licitación. (Garay et al., 2023, p. 123).

Marín et al., (2024) “Conformidad en realizar obras y estas pueden ser públicas y/o privadas; para los efectos de nuestro estudio, las obras públicas son las obras y actividades realizadas en el campo de la construcción civil que requiera: gestión técnica, programación técnica certificado, mano de obra, materiales y suministros, etc.; El equipo debe ejecutarse con asignación a partidas presupuestarias que son aprobados y emitidos independientemente por fuente de recursos financiero, para construcción, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de inmuebles, así como la realización de obras de construcción infraestructura urbana y rural y demás construcciones necesarias para logro de los objetivos descritos en los proyectos de inversión aprobados por Perú invierte, también se consideran los desembolsos realizados en servicios profesionales relacionados con esto, como proyectos, dibujos,

estudios, asesoramiento y cualquier otro de naturaleza inmaterial que sea preliminar se considera un estudio de naturaleza similar”. (p. 123)


Campos & Bedoya, (2024) “Por lo tanto, los propietarios de proyectos públicos están involucrados en ambos largos plazos, foco en la innovación y desarrollo estratégico de objetivos de la organización pública, así como la orientación a corto plazo sobre los objetivos de eficiencia temporal de la red relacionada con el diseño de partes públicas y/o privado”. (p. 93)

(Villanueva, 2024) “En este sentido, contribuye a la gestión de valores en la construcción de dos maneras. En primer lugar, necesitamos identificar el conjunto de valores público-privados desde la perspectiva del cliente público que entra en juego durante la prestación de servicios públicos en el sector de la construcción. La mayoría de los estudios sobre valores públicos reconoce la importancia de los grupos de valores cuestiones procesales como la legalidad y la rendición de cuentas, así como los valores de actuación”. (p. 102)

Eficiencia y eficacia. De Alzola, (2024) “En el libro del autor Contratación Pública (Burzaco Samper, 2014) se puede Ver un fragmento de la imagen a continuación sobre la ejecución de la obra. Culminación de obras públicas”.

Contratos del sector público:

Figura 2 Contratos del sector público

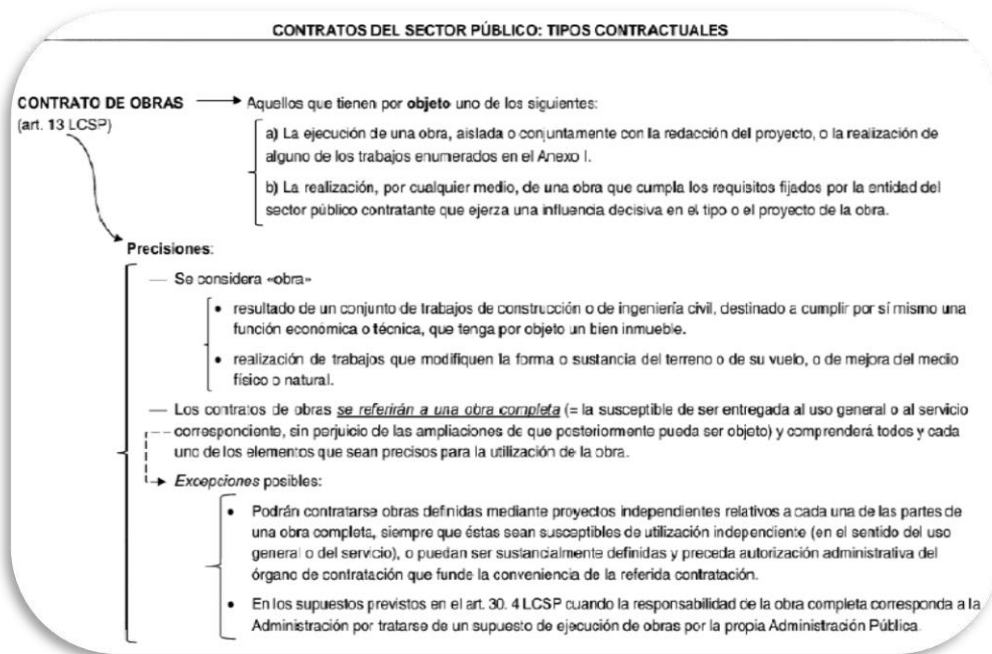

Fuente: (Burzaco Samper, 2014)

Respecto de las disposiciones reglamentarias que contempla el artículo 1 de la Ley N° 30225 se refieren a contratos estatales publicados en (Diario el Peruano, 2019). El objetivo es establecer estándares que apunten a maximizar

Casapino et al., (2024) “valor de los recursos públicos invertidos y promoción de acciones en el marco de Enfoque de gestión basado en resultados para la adquisición de bienes, servicios y trabajos, para que estén terminados a tiempo y bajo el mejor las condiciones de precio y calidad permiten alcanzar los objetivos públicos y tienen un impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos”. (Diario Peruano, 2019)

Reglamento de la Ley N° 30225 Contrataciones del Estado, (2022) Artículo 53.1: Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la entidad utiliza, según corresponda, los siguientes procedimientos de selección:

- a) Licitación Pública.
- b) Concurso Público.
- c) Adjudicación Simplificada.

- d) Subasta Inversa Electrónica.
- e) Selección de Consultores Individuales.
- f) Comparación de Precios.
- g) Contratación Directa.

Dimensión ejecución contractual

Ayala et al., (2024) “El cumplimiento del contrato es la etapa en la cual las partes de un contrato cumplen las obligaciones establecidas en el acuerdo. En este punto, cada parte deberá realizar las acciones acordadas para ejecutar el contrato. Por ejemplo, en un contrato de construcción, el ofertante debe ejecutar la obra y la entidad debe pagar el monto acordado. Para que un contrato sea válido, ambas partes deben cumplir sus obligaciones. Si una parte no cumple con sus obligaciones, la otra parte puede utilizar sus recursos prueba para probar el contrato. El cumplimiento del contrato se puede garantizar: revisando el contrato antes de firmarlo, monitoreando su cumplimiento durante toda la duración del acuerdo. (p. 74)

La etapa de la contratación pública en la que las partes prestan los servicios pactados: El postor ejecuta la obra, suministra el bien o presta el servicio y, a su vez, la entidad realiza el pago pactado en el contrato.

Dimensión garantías de adelanto

Entrena, (2024) “La garantía de pago anticipado en la contratación pública es una condición para que el contratista reciba un pago anticipado de fondos. Su finalidad es garantizar que el empresario utilice los fondos de forma adecuada. El pago anticipado se presenta cuando el contrato exige un pago anticipado de fondos para realizar un proyecto u obra. El importe de la garantía deberá ser igual al importe del anticipo prestado”. (p. 65)

La regulación de las garantías en el régimen general de los contratos estatales se fundamenta en el artículo 39 de la LCE. Esta norma legal define los requisitos esenciales que deben respetarse garantías ofrecidas a las entidades, así como sus tipos (según el objetivo de lo que debe asegurarse), disponiéndose, en cambio, que reglamentariamente se completen las relativas a "sus términos, importes y condiciones". (p. 109)

Dimensión modificación del contrato

Entrena, (2024) “Las modificaciones al contrato de la Ley de Contrataciones Públicas (APP) se realizan cuando es necesario para lograr el objetivo del contrato de manera eficiente y oportuna. Las modificaciones pueden ser convencionales o resultar de una ejecución de la entidad o del contrato.

Las modificaciones convencionales son aquellas convenidas entre las partes cuando no puedan aplicarse reducciones, adiciones o complementos. Cambios por disposición de la entidad o entidad Las intervenciones contractuales se llevan a cabo cuando es necesario para lograr el objetivo del contrato de manera eficiente y oportuna”. (p. 187)

Las modificaciones al contrato LCE podrán incluir: ampliación de duración, reducción de beneficios, beneficios adicionales.

Para que un contrato de LCE sea modificado, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

Por los hechos que motivan la modificación

Que la modificación no se atribuye a ninguna parte

Que el cambio logre el objetivo del contrato en tiempo y forma.

Que la modificación no modifica los elementos definitorios del objeto del contrato

Dimensión culminación de ejecución contractual

Casapino et al., (2024) “La culminación de la ejecución contractual en el OSCE se da cuando las partes cumplen con las prestaciones que se acordaron en el contrato. La ejecución contractual es la fase en la que las partes involucradas en un contrato cumplen con las obligaciones que se establecieron en el mismo. Para el caso de los contratos de obra, el contrato finaliza cuando se ha liquidado la obra y se ha efectuado el pago correspondiente.


Para obtener más información sobre la ejecución contractual y el término de la vigencia de un contrato, se puede consultar:

La Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225)

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

El Sistema Peruano de Información Jurídica

Figura 3 Ejecución contractual



Fuente: Elaboración propia

2.3. Definición de términos básicos

- a) **Adquisiciones:** “Implica obtener un producto y/o servicio de una venta. El comprador solicita que se ejecute una orden de compra y La cancelación es aprobada por el vendedor”. (Economipedia, 2016.).
- b) **Área usuaria:** “Esta es la delegación que se encarga de gestionar las solicitudes de los usuarios. bienes, servicios y obras, de igual forma que lo hagan para el logro de objetivos y fines”. (Machuca y Rojas, 2020)
- c) **Bases de concurso:** “Son los documentos para llevar a cabo procesos de contratación o licitación pública, Subasta inversa electrónica y concesión

simplificada, que incluye una serie de reglas elaboradas por la Autoridad para la planificación y elaboración de contratos”. (Glosario de información de compras, 2016).

- d) **Bueno Pro:** “Se trata de una operación administrativa en la que se indica que un proveedor con puntuación alta y fue declarado ganador en el desarrollo de selección”. (Portal del Estado Peruano, 2020).
- e) **Cotizaciones:** “Es el documento o comunicación en el que se hace constar un acuerdo de que El número se emite desde el área de compras. Este documento no contiene información contable. La evaluación es el acto y el producto que consta de la cotización (estimar el precio de un bien, indicar a alguien o algo una relación con un objetivo, pago en varias cuotas). Este documento se utiliza para indicar o utilizar el valor de un bien o servicio”. (Zelles, 2007)
- f) **Contratación con el estado:** (Nuñez & Talavera, 2021) “La ejecución de un contrato individual se realiza a través de personas físicas o grupos, acuerdo entre ambas partes, generalmente celebrado por el empleador y el trabajador, con el fin de realizar una actividad, por la cual el trabajador recibe una suma de dinero convenida en el contrato o una recompensa compensatoria de cualquier tipo. Naturaleza”. (Definición ABC, 2012).
- g) **Empresario o contratista:** “Es una organización o persona que se encarga de la distribución voces necesario para la ejecución de las obras de construcción en un tiempo determinado y con regularidad”. (Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2020).
- h) **Conformidad de obra o servicio:** “Este término puede utilizarse para indicar el cumplimiento dentro de correspondencia y/o semejanza de igualdad entre 2 o más elementos”. (Hernández, 2018)

- i) **Especificaciones técnicas:** “Es el documento impreso donde se detallan y muestran las especificaciones. Reglamento, requisitos y acciones a utilizar y renunció a la realización de obras de construcción, estudios para su desarrollo, producción de equipos”. (Valeriano, 2013)

2.4. Formulación de hipótesis

Nuestra hipótesis general se fundamenta en la siguiente proposición:

2.4.1. Hipótesis general

La gestión de contrataciones del Estado se relaciona con el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

2.4.2. Hipótesis específica

- a) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.
- b) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024.
- c) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024.
- d) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con la culminación de ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

2.5. Identificación de variables

Variable 1: Gestión de contratación del estado

Dimensión

Planificación

Indicadores

X1 Cuadro de necesidades

X2 Plan anual de contratación (PAC)

X3 Comité de selección

X4 Bases para procesos.

X5 Expedientes de contratación.

Dimensión

Marco normativo

Indicadores

X6 Bienes y servicios

X7 Plazos estipulados

X8 Aprovisionamiento según Ley reglamentos y directivas

X9 Servicios de consultoría de obras

Dimensión

Proceso de selección

Indicadores

X10 Contrataciones Bs y Ss y obras

X11 Registro de participantes

X12 Respuestas a dudas de clientes.

X13 Consultas y observaciones con SEACE

Dimensión

Ejecución contractual

Indicadores

X14 Contratos

X15 Conformidad del servicio, bien y obras.

X16 Estandarización de un bien o servicio.

X17 Plazos de ejecución contractual.

Dimensión

Tecnológico

Indicadores

X18 Herramientas tecnológicas

X19 Informática de análisis estadístico.

X20 Uso de correo electrónico.

X21 Página web institucional.

Variable 2: Culminación de obras públicas**Dimensión**

Ejecución contractual

Y1 Plazos para la ejecución

Y2 Vigencia contrata

Y3 Nulidad de contrato

Dimensión

Garantías y adelantos

Indicadores

Y4 Fiel cumplimiento

Y5 Adelanto

Y6 Cargo de la entidad

Y7 Ejecución de garantía

Dimensión

Modificación del contrato

Indicadores

Y8 Adicionales y reducciones

Y9 Ampliación de plazos

Y10 Modificación de contrato

Dimensión

Incumplimiento de contrato

Indicadores

Y11 Penalidades.

Y12 Causales de resolución.

Y13 Efectos de resolución.

Dimensión

Culminación de ejecución contractual

Indicadores

Y14 Recepción.

Y15 Conformidad del pago.

Y16 Liquidación

2.6. Definición operacional de variables e indicadores

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	E.M
V.1. Gestión de contrataciones del estado	Se entiende por gestión de contratos el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el adecuado funcionamiento de la gestión de los contratos estatales y el uso del conocimiento. Asimismo, se refiere a las tareas y comprar suministros con uso de fondos o recursos Se han completado obras públicas obligatorio por contrato y oferta, y además compra o transferencia de productos (Martínez Zamora, 2022).	Se medirá mediante sus dimensiones: planificación, marco normativo, proceso de selección, ejecución contractual, tecnológico en una escala Likert a través de un cuestionario.	Planificación	Cuadro de necesidades Plan anual de contratación (PAC)	Ordinal
				Comité de selección	
				Bases para procesos	
				Expediente para bienes	
				Expediente para servicios	
			Marco normativo	Bienes y Servicios	
				Plazos estipulados	
				Aprovisionamiento según ley reglamentos y directivas	
				Servicios de consultoría de obras	
			Proceso de selección	Contrataciones Bs y Ss y obras	
				Registro de participantes	
				Respuesta a dudas de los clientes	
				Consultas y observaciones con SEACE	
			Ejecución contractual	Contratos	
				Conformidad del servicio, bien y obra	
				Estandarización de un bien o servicio	

				Plazos de ejecución contractual	
				Herramientas tecnológicas	
				Informática de análisis estadístico	
				Uso de correo electrónico	
				Página web institucional	
Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	E.M
V.2: Cumplimiento de obras públicas	Esta es la secuencia lógica de actividades constructivas que son fabricados en un periodo determinado ejecuciones; que incluye solo artículos de presupuesto del expediente técnico, y también enlaces posibles que pudiera presentarse. (Normas legales diario El Peruano 2022)	Se medirá mediante sus dimensiones ejecución contractual, garantías y adelantos, modificaciones del contrato, incumplimiento de contrato y culminación en una escala Likert a través de un cuestionario.	Ejecución contractual	Plazos para la ejecución	Ordinal
				Vigencia contrata	
				Nulidad de contrato	
			Garantías y adelantos	Fiel cumplimiento	
				Adelantos	
				Cargo de la entidad	
			Modificación del contrato	Ejecución de garantías	
				Adicionales y reducciones	
				Ampliación de plazos	
			Incumplimiento de contrato	Modificación de contrato	
				Penalidades	
				Causales de resolución	
			Culminación de ejecución contractual	Efectos de resolución	
				Recepción	
				Conformidad del pago	
				Liquidación	

Fuente Elaboración propia

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación no es experimental, según Hernández-Sampieri et al., (2014) “El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental. El enfoque cuantitativo permite medir y analizar numéricamente la relación entre las variables planteadas, a partir de datos recolectados de manera sistemática y objetiva”.

3.2. Nivel de investigación

El nivel de la relación, según Bernal, (2010) “El alcance correlacional tiene como finalidad medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular.

No busca explicar por qué ocurre la relación (eso es el nivel explicativo), sino cuánto se asocian las variables. Evalúa la correlación (positiva, negativa o nula) mediante técnicas estadísticas como el coeficiente de Pearson o Spearman.”.

3.3. Métodos de investigación

Según Corbetta, (2012)), el método a utilizar en la investigación: inductivo, deductivo y dialéctico para sistematizar, explicar los resultados de "búsqueda" (p.187).


Los métodos de investigación son las estrategias, técnicas o procesos utilizados para recopilar datos y evidencia. El objetivo es adquirir nueva información o comprender mejor un tema. En nuestra investigación utilizaremos el método inductivo correlacional. En tesis que pasan de casos especiales a casos generales. Nuestros estudios nos llevarán a formular una hipótesis que tú u otros investigadores apoyarán para que se convierta en una teoría. O bien puede proponer una ecuación que se aplique a un rango de valores más apropiado que el aceptado hasta ahora.

3.4. Diseño de investigación

Esto corresponde al concepto correlacional, según Briones, (2001)), “En cuanto al diseño, se adopta el tipo no experimental, ya que no se manipulan intencionalmente las variables independientes. Es decir, los fenómenos se observan tal como ocurren en su contexto natural, sin intervención del investigador sobre las condiciones del entorno. El propósito de este diseño es analizar la relación existente entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco durante el año 2024, a partir de la observación directa y el análisis de datos obtenidos de los colaboradores involucrados en dichos procesos”.

Que la modificación no sea atribuible a ninguna parte

Por hacer El cambio logra el objetivo del contrato de manera oportuna y eficiente. Que la modificación no modifica los elementos definitorios del objeto del contrato" (pág.88).



Donde:

M: Muestra en la que se realiza el estudio

O1: Observaciones de la variable 1 Contratación con el estado

O2: Observaciones de la variable 2 Cumplimientos de obras públicas

r: Relación de las variables de estudio

3.5. Población y muestra

3.5.1. Población

En el contexto de la investigación, el término “población” se refiere al grupo de elementos que comparten una característica o atributo específico y que son objeto de un estudio. La población representa a todos los individuos, objetos, eventos o fenómenos que cumplen los criterios definidos para ser parte de la investigación.

Es importante definir claramente la población en un estudio de investigación porque ayuda a definir los límites y el propósito del estudio, así como seleccionar buenas muestras y obtener resultados generalizables y representativos. La población está compuesta por 259 colaboradores del Gobierno Regional de Pasco de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) aprobado de acuerdo a la Ordenanza Regional No. 344-2014-G.R. PASCO/GR.

3.5.2. Muestra

La muestra en la presente investigación será de tipo probabilística 156 colaboradores del Gobierno Regional de Pasco, asimismo que fue considerado con un

margen de error de 5%, la distribución estándar de 1.96, nuestra tasa de acierto será de 0.5 y un fracaso es de 0.5; para lo cual se utilizaremos la siguiente fórmula: Probabilístico.

$$n = \frac{Z^2 p q N}{E^2 (N-1) + Z^2 p q}$$

Donde:

N = Población

n = Muestra

Z = Distribución Estándar

E = Margen o probabilidad de error

p = Tasa de acierto o éxito

q = Tasa de fracaso o error

Sustituyendo valores poseemos:

$$n = \frac{1.96^2 (0.5) (0.5) 259}{0.05^2 (259-1) + 1.96^2 (0.5) (0.5)}$$

$$n = \frac{248.7436}{1.6079}$$

n = 156 muestras

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos utilizados en la investigación serán cuestionarios: los cuestionarios son formularios que contienen una serie de preguntas que pueden ser contestadas de forma escrita o en formato electrónico. La investigación está estructurada, utilizando una escala Likert. Los cuestionarios permiten recopilar datos de una muestra amplia de participantes y facilitan el análisis cuantitativo de los datos.

3.6.1. Técnica

Para la presente investigación, se empleará la técnica de la encuesta como instrumento principal para la recolección de datos. Esta encuesta se clasifica como directa, ya que la información será obtenida de manera inmediata y personal por parte del equipo encuestador. Los datos serán recolectados específicamente del personal que labora en las áreas de adquisiciones y procesos del Gobierno Regional de Pasco, ámbito en el cual se desarrolla el estudio. Padua et al., (1979)

- a) Para la variable X: Gestión de contrataciones (Encuesta directa)
- b) Para la variable Y: cumplimiento de obras (Encuesta directa)

3.6.2. Instrumentos

Las herramientas de investigación son herramientas que se utilizan para recopilar datos y obtener información relevante en el proceso de investigación. Estas herramientas que se utilizó en la investigación fue la guía de cuestionario y el cuestionario con escala de Likert.

Escalas de medición: Las escalas de medición son instrumentos utilizados para medir características o variables específicas en una escala cuantitativa. Estos niveles pueden incluir niveles de actitudes, escalas de valoración, escalas de intensidad, entre otras. Se utilizan para obtener medidas numéricas y comparables de variables de interés.

3.6.3. Recolección de datos

Se aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Para su elaboración, se desarrolló previamente una guía basada en la operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores definidos en el estudio. El cuestionario fue diseñado utilizando la escala de Likert, con el objetivo de medir el nivel de competencias y habilidades de los colaboradores, así como su desempeño laboral en el contexto de la gestión de contrataciones y el cumplimiento de obras públicas.

Para la variable contrataciones del estado se utilizará la siguiente escala de Likert:

1. Muy en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indiferente
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo

Mientras para la variable y cumplimiento de obras públicas se utilizará la siguiente escala de Likert:

1. Nunca
2. Casi nunca
3. A veces
4. Casi siempre
5. Siempre

La tabulación de datos se hará en forma manual y con herramientas informáticas en lo que corresponda.

3.7. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación

Para la selección de los instrumentos, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente con el objetivo de identificar las herramientas de medición más adecuadas para las variables objeto de estudio. En este proceso se analizaron instrumentos previamente validados y ampliamente utilizados en investigaciones similares, lo que sirvió de base para la elaboración de los instrumentos propios.

3.7.1. Validez de los instrumentos de investigación

Una vez seleccionados, se procedió a su validación, la cual incluyó una evaluación de la validez de contenido. Esta etapa tuvo como propósito garantizar que

los ítems de los cuestionarios fueran pertinentes y representativos de los constructos que se pretendía medir. Para ello, se contó con el valioso apoyo de profesionales locales, quienes, gracias a su experiencia y conocimientos, colaboraron en la validación de los instrumentos.

Figura 4 *Validación por expertos*

N°	Nombres a apellidos de expertos	Grado académico	Cargo
1	Mg. Shirley Teresa Vargas Allende	Magister	Docente Universitario
2	Mg. Erick Luis Solorzano Calixto	Magister	Docente Universitario
3	Mg. Ángel Wilmer Huayna Gonzales	Magister	Docente Universitario

Fuente: elaboración propia

3.7.2. Confiabilidad de los instrumentos de investigación

Con el fin de garantizar la confiabilidad de los instrumentos, se realizó un análisis de consistencia interna utilizando el coeficiente alfa de Cronbach. Este procedimiento permitió evaluar la coherencia entre los ítems de cada instrumento, asegurando que todos midieran de forma consistente las mismas dimensiones teóricas. Los resultados presentados en las Tablas evidencian el nivel de fiabilidad de los instrumentos empleados en la investigación.

Figura 5 *Reactivos de gestión de contratación pública*

Estadísticas de total de elemento	
	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
V1 Gestión de contratación pública	0.811
Dimensión planificación	0.868
Dimensión Marco Normativo	0.832
Dimensión Proceso de Selección	0.840
Dimensión Ejecución Contractual	0.788
Dimensión Tecnología	0.795
V2 Cumplimiento de Obras	0.799
Dimensión Ejecución Contractual	0.857
Dimensión Garantías de Adelanto	0.844
Dimensión Incumplimiento de Contrato	0.804
Dimensión Culminación	0.776
Promedio	0.819

Fuente: elaboración propia

Figura 6 *Reactivos de Gestión de contratación pública*

Variable y dimensiones	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
V1 Gestión de contratación pública	0.811
Dimensión planificación	0.868
Dimensión Marco Normativo	0.832
Dimensión Proceso de Selección	0.840
Dimensión Ejecución Contractual	0.788
Dimensión Tecnología	0.795
Promedio	0.822

Fuente: elaboración propia

Figura 7 Reactivos de cumplimiento de obra

Variable y dimensiones	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
V2 Cumplimiento de Obras	0.799
Dimensión Ejecución Contractual	0.857
Dimensión Garantías de Adelanto	0.844
Dimensión Incumplimiento de Contrato	0.804
Dimensión Culminación	0.776
Promedio	0.820

Fuente: elaboración propia

Figura 8 Valor de alfa de Cronbach

Valor de α	Interpretación
$\alpha \geq 0.90$	Excelente fiabilidad
$0.80 \leq \alpha < 0.90$	Buena fiabilidad
$0.70 \leq \alpha < 0.80$	Aceptable
$0.60 \leq \alpha < 0.70$	Cuestionable (moderada, puede mejorarse)
$0.50 \leq \alpha < 0.60$	Pobre (baja fiabilidad)
$\alpha < 0.50$	Inaceptable

Fuente: Cronbach, L. J. (1951).

Figura 9 Estadística de fiabilidad alfa de Cronbrach

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,837	11

Fuente: elaboración propia

Como resultado tenemos que el alfa de Cronbach es de 0.837 es decir 684% se puede concluir que es de buena fiabilidad.

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Una vez que se recopilan datos para la investigación, estos deben procesarse y analizarse para obtener información significativa y responder a las preguntas de

investigación. A continuación, se presentan algunas técnicas comunes de procesamiento y análisis de datos:

Codificación de datos: La codificación implica asignar etiquetas o categorías a los datos recopilados. Esto se puede hacer manualmente o con un software especializado. La codificación hace las cosas más fáciles Organización y gestión de datos, permitiendo su posterior análisis.

Tabulación y resumen: La tabulación es el proceso de organizar datos en tablas, donde se presentan frecuencias, porcentajes y otros resúmenes estadísticos. Esto hace que sea más fácil visualizar y comprender los datos. Se pueden utilizar herramientas como hojas de cálculo o software estadístico para crear estas tablas y resúmenes.

Análisis descriptivo: El análisis descriptivo se utiliza Para resumir y describir los datos recopilados. Esto incluye el cálculo de medidas de tendencia central (como la media, la mediana y la moda) y medidas de dispersión (como la desviación estándar y el rango). El análisis descriptivo proporciona una descripción general de los datos y permite identificar patrones o características importantes.

Análisis inferencial: El análisis inferencial se utiliza para sacar conclusiones generales o para sacar conclusiones sobre una población más grande, basado en datos de muestra.

Figura 10 Baremos con variables y dimensiones

	VI	D1	D2	D3	D4	D5	VD	D1	D2	D3
Mínimo	76	20	13	13	10	9	41	10	9	10
P30	96	21	17	15	23	20	52	11	14	14
P70	104	24	17	19	25	20	57	14	17	16
Máximo	105	27	18	19	28	22	60	16	18	16

Fuente: Elaboración propia

Figura 11 Baremo de gestión de contrataciones y cumplimiento de obras

VARIABLES Y DIMENSIONES	NIVEL INICIO	NIVEL PROCESO	NIVEL LOGRADO
Gestión de Contrataciones pública	76 -96	97 - 104	105 – 106
Planificación	20 -21	22 -24	24 -27
Marco Normativo	13 - 17	18 -19	20 – 21
Proceso de selección	13 - 15	16 -19	20 – 21
Ejecución contractual	10 -23	24 -25	26 -28
Tecnológica	9 -20	21 -22	23 -24
Cumplimiento de obras	41 -52	53 -57	58 -60
Ejecución contractual	10 -11	12 - 14	15 – 16
Garantía y adelanto	9 - 14	15 - 17	18 – 19
Incumplimiento de contrato	10 - 14	15 - 16	17 – 18
Culminación de ejecución	7 - 12	13 - 14	15 – 16

Fuente: Elaboración propia

3.9. Tratamiento estadístico

El procesamiento estadístico se refiere a todas las técnicas y procedimientos utilizados para analizar, interpretar y extraer conclusiones de los datos recopilados en una encuesta. El propósito del procesamiento estadístico es identificar patrones, relaciones y tendencias en los datos y proporcionar una base objetiva para tomar decisiones o sacar conclusiones. Se sigue algunos pasos como: Exploración de datos, prueba de hipótesis, análisis de correlación.

3.10. Orientación ética, filosófica y epistémica

Las pautas éticas en la investigación son esenciales para garantizar la integridad, la confianza y el respeto a los participantes y los principios morales durante todo el proceso de investigación. A continuación, se presentan algunas pautas y principios éticos importantes que conviene tener en cuenta:

“Consentimiento informado: Los participantes deben estar completamente informados sobre los propósitos, procedimientos, riesgos y beneficios de la investigación antes de dar su consentimiento. participar. Deberían tener libertad para decidir si quieren participar y deberían ser tratados con respeto y dignidad”. (Bunge, 1999)

(Bunge, 1999) “Confidencialidad y privacidad: Los investigadores deben garantizar la confidencialidad y privacidad de los participantes. «Los datos y la información recopilada deben manejarse de forma segura y protegida, evitando cualquier divulgación o identificación no autorizada de los participantes”.

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Descripción del trabajo de campo

Durante el trabajo de campo, y una vez obtenidos los permisos correspondientes por parte de los responsables de la entidad investigada, se procedió a identificar a la muestra seleccionada. Posteriormente, se aplicaron los cuestionarios con el fin de recolectar información sobre la gestión de contrataciones del Estado y su relación con el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024.

Se elaboró una planificación detallada del proceso, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y se garantizó en todo momento la confidencialidad de la información proporcionada. La aplicación de entrevistas semiestructuradas, utilizando la escala de Likert, junto con observaciones directas, permitió una comprensión más profunda de las percepciones y experiencias de los colaboradores.

Todos los datos recolectados fueron registrados de manera rigurosa y se realizó un análisis preliminar para identificar tendencias y patrones relevantes. Además, se implementó una supervisión constante para asegurar la calidad y fiabilidad de la información obtenida.

4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados

Genero

Tabla 1 Género: varón y mujer

Género: Varón y Mujer


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Varón	90	57,7	57,7
Mujer	66	42,3	42,3
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto al género, se obtuvo el siguiente resultado: el 58% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, son varones, entre tanto el 42% son mujeres de muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024.

Gráfico 1 Género varón y mujer



Fuente: elaboración propia

4.2.1. Variable 1 gestión de contrataciones del estado

Tabla 2 *Gestión de contrataciones públicas*


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	53	34,0	34,0
Nivel proceso	60	38,5	38,5
Nivel logrado	43	27,6	27,6
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la variable gestión de contrataciones públicas, se obtuvo el siguiente resultado: el 39% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel proceso, entre tanto el 34% están en el nivel inicio, mientras que el 28% en el nivel logrado de muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Gráfico 2 *Gestión de contrataciones públicas*

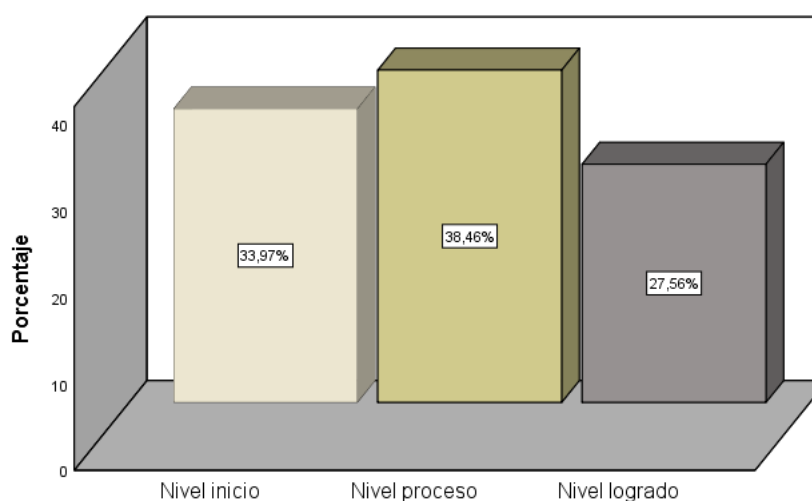

Fuente: Base de datos

Dimensión Planificación

Tabla 3 Dimensión Planificación


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	50	32,1	32,1
Nivel proceso	73	46,8	46,8
Nivel logrado	33	21,2	21,2
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión planificación, se obtuvo el siguiente resultado: el 47% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel proceso, entre tanto el 32% están en el nivel inicio, mientras que el 21% en el nivel logrado de muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Gráfico 3 Dimensión planificación

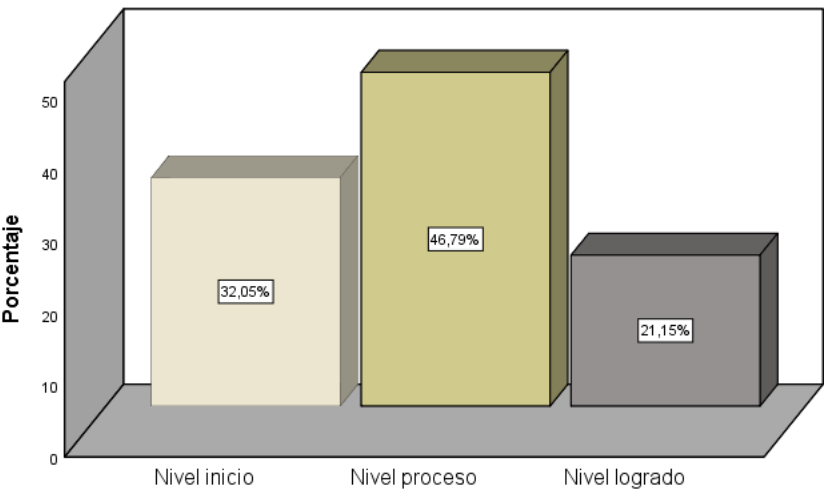

Fuente: Base de datos

Dimensión Marco normativo

Tabla 4 *Dimensión marco normativo*


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	146	93,6	93,6
Nivel proceso	10	6,4	6,4
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión marco normativo, se obtuvo el siguiente resultado: el 94% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel inicio, entre tanto el 6% están en el nivel proceso, de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel inicio.

Gráfico 4 *Dimensión marco normativo*

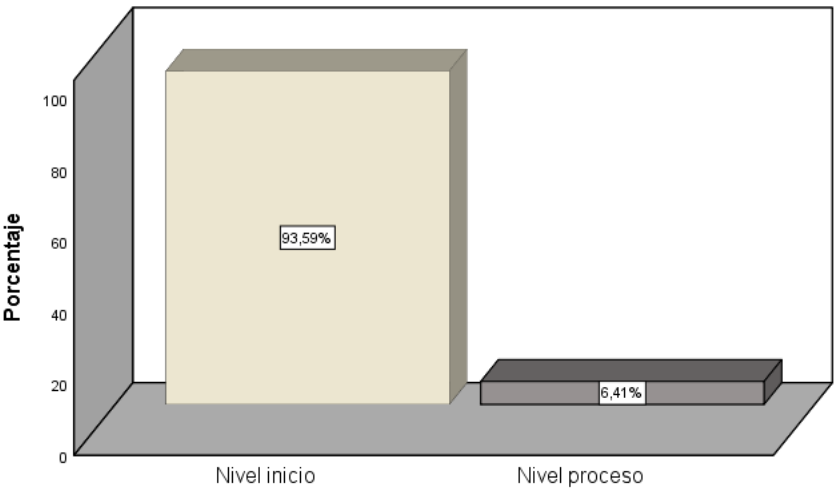

Fuente: Base de datos

Dimensión Proceso de selección

Tabla 5 Dimensión proceso de selección


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	51	32,7	32,7
Nivel proceso	105	67,3	67,3
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión proceso de selección, se obtuvo el siguiente resultado: el 67% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel proceso, entre tanto el 33% están en el nivel inicio, de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Gráfico 5 Dimensión proceso de selección

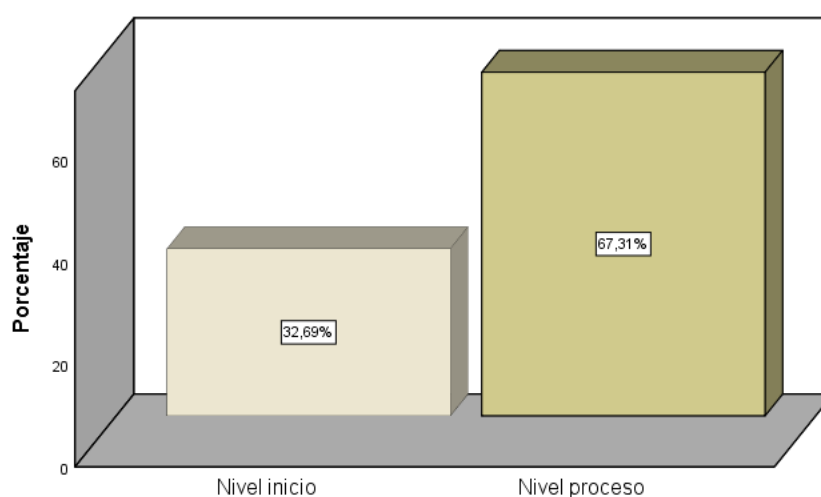

Fuente: Base de datos

Dimensión Ejecución contractual

Tabla 6 Dimensión ejecución contractual


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	53	34,0	34,0
Nivel proceso	63	40,4	40,4
Nivel logrado	40	25,6	25,6
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión ejecución contractual, se obtuvo el siguiente resultado: el 40% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel proceso, entre tanto el 34% están en el nivel inicio, mientras que el 26% en el nivel logrado de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Gráfico 6 Dimensión ejecución contractual

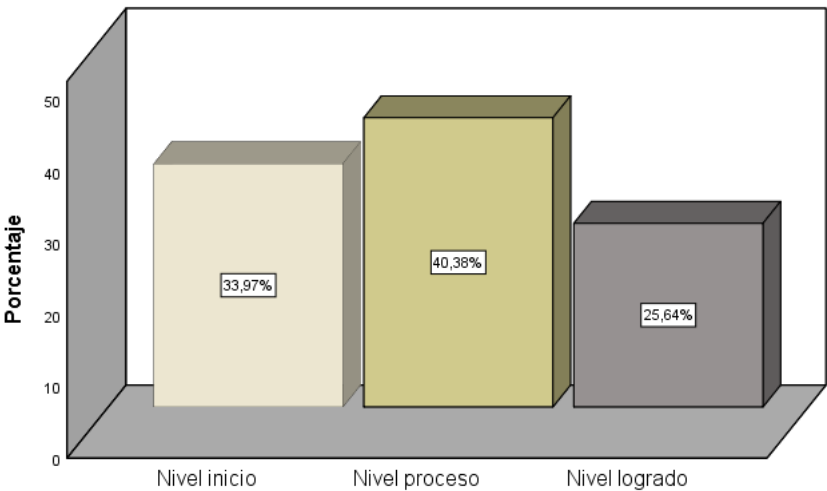

Fuente: Base de datos

Dimensión Tecnológica

Tabla 7 Dimensión tecnológica


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	116	74,4	74,4
Nivel proceso	40	25,6	25,6
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión tecnológica, se obtuvo el siguiente resultado: el 74% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, están en el nivel inicio, entre tanto el 26% están en el nivel proceso, de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel inicio.

Gráfico 7 Dimensión tecnológica

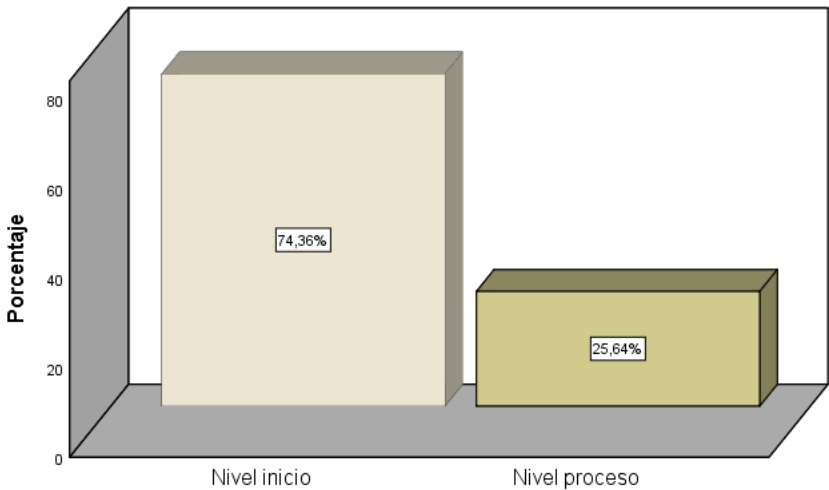

Fuente: Base de datos

4.2.2. Variable 2 Variable Cumplimiento de obras

Tabla 8 Variable2 cumplimiento de obras públicas


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	53	34,0	34,0
Nivel proceso	93	59,6	59,6
Nivel logrado	10	6,4	6,4
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la variable cumplimiento de obras, se obtuvo el siguiente resultado: el 60% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel proceso, entre tanto el 34% están en el nivel inicio, mientras que el 6% en el nivel logrado de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Gráfico 8 Variable 2 cumplimiento de obras públicas

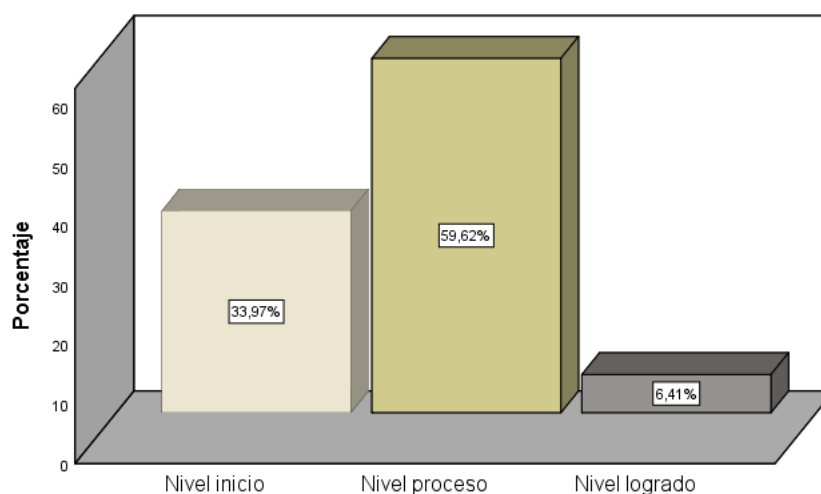

Fuente: Base de datos

Dimensión Ejecución contractual

Tabla 9 *Dimensión ejecución contractual*


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	85	54,5	54,5
Nivel proceso	31	19,9	19,9
Nivel logrado	40	25,6	25,6
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión ejecución contractual, se obtuvo el siguiente resultado: el 5% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, están en el nivel inicio, entre tanto el 26% están en el nivel logrado, mientras que el 20% en el nivel proceso de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel inicio.

Gráfico 9 *Dimensión ejecución contractual*

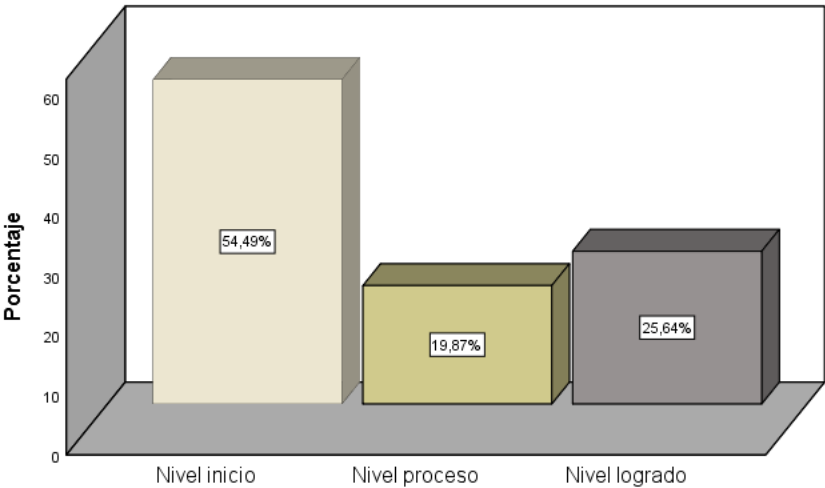

Fuente: Base de datos

Dimensión Garantía de adelanto

Tabla 10 *Dimensión garantía de adelanto*


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	62	39,7	39,7
Nivel proceso	84	53,8	53,8
Nivel logrado	10	6,4	6,4
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión garantía de adelanto, se obtuvo el siguiente resultado: el 54% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, están en el nivel proceso, entre tanto el 40% están en el nivel inicio, mientras que el 6% en el nivel logrado de muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel proceso.

Gráfico 10 *Dimensión garantías de adelanto*

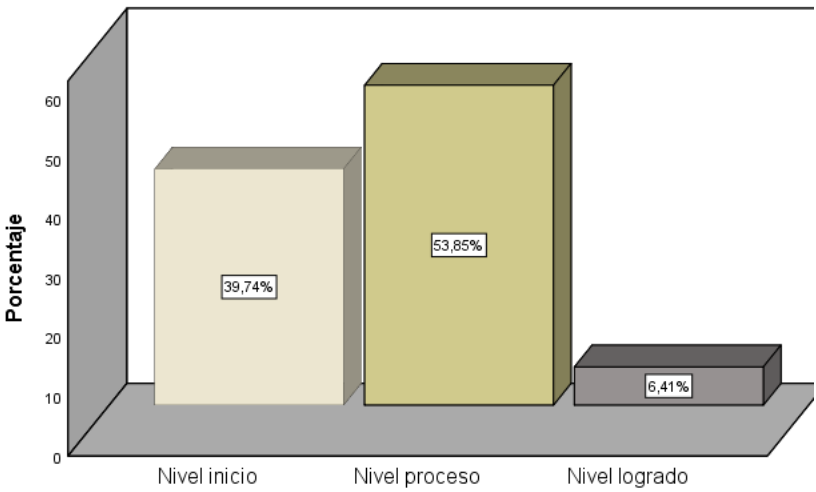

Fuente: Base de datos

Dimensión Incumplimiento de contrato

Tabla 11 *Dimensión incumplimiento de contrato*


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	83	53,2	53,2
Nivel proceso	73	46,8	46,8
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión incumplimiento de contrato, se obtuvo el siguiente resultado: el 53% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, contestaron que están en el nivel inicio, entre tanto el 47% están en el nivel proceso, de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel inicio.

Gráfico 11 *Dimensión incumplimiento de contrato*

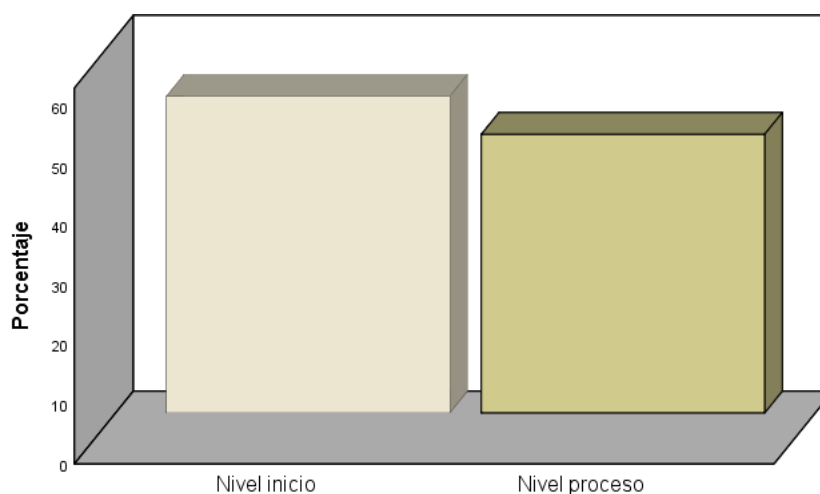

Fuente: Base de datos

Dimensión Culminación de ejecución

Tabla 12 *Dimensión culminación de ejecución*


	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido
Nivel inicio	107	68,6	68,6
Nivel proceso	32	20,5	20,5
Nivel logrado	17	10,9	10,9
Total	156	100,0	100,0

Fuente: Base de datos

Interpretación:

En el Tabla y figura respecto a la dimensión culminación de ejecución, se obtuvo el siguiente resultado: el 69% de encuestados a los colaboradores del gobierno Regional de Pasco, están en el nivel inicio, entre tanto el 21% están en el nivel proceso, mientras que el 11% en el nivel logrado de una muestra de 156 observaciones en la investigación Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco - 2024. Por lo que se concluye que están en el nivel inicio.

Gráfico 12 *Dimensión culminación de ejecución*

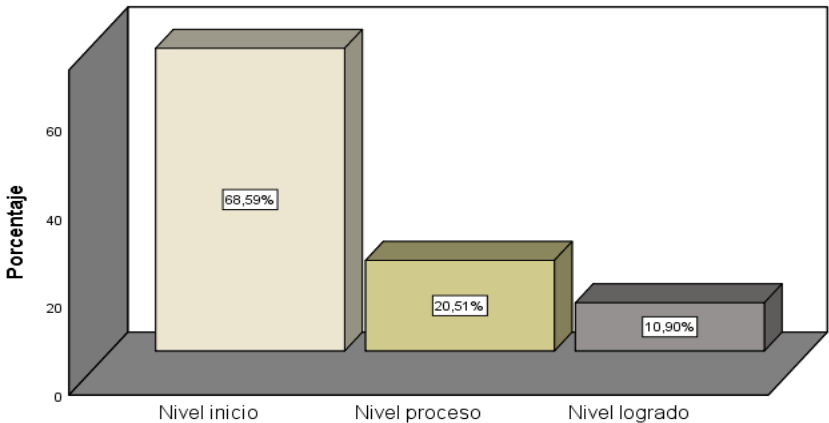

Fuente: Base de datos

4.3. Prueba de hipótesis

Seguidamente, se procederá a realizar la prueba de normalidad con el objetivo de determinar la distribución de los datos recolectados. Este análisis es fundamental, ya

que permitirá establecer si los datos se ajustan a una distribución normal, lo cual es un criterio clave para seleccionar el tipo de prueba estadística más adecuada. En función de los resultados obtenidos, se decidirá si corresponde aplicar pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas, garantizando así la validez y rigor del análisis inferencial.

Prueba de normalidad

Estadística paramétrica

Las suposiciones son:

Los datos tienen una distribución normalidad.

La Homogeneidad de varianzas de sus datos

Estadística no paramétrica

Los datos analizados no tienen presuposiciones

La prueba de distribución libre

Kolmogorov – Smirnov $n \geq 50$ mientras que Shapiro – Wilk $n \leq 50$

1) Planteamiento de la hipótesis

H₀ Los datos ostentan una distribución normal

H_a Los datos no ostentan una distribución normal

2) Nivel de significancia

Confianza 95%

Significancia (alfa) 5%

3) Prueba estadística a emplear

Debido a que los datos son mayor a 50 aplicaremos la prueba de Kolgomorov – Smirnov.

4) Criterios de decisión

Si $p < 0,05$ rechazamos la H_0 y acepta la H_a

Si $p > 0,05$ aceptamos la H_0 y rechazamos la H_a

Tabla 13 Prueba de normalidad para las variables

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
VI Gestión Contratación	,217	156	,000	,800	156	,000
VD Cumplimiento de Obras	,288	156	,000	,806	156	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Base de datos

Prueba de Kolgomorov – Smirnov para cada variables y dimensiones

Tabla 14 Prueba de Kolgomorov – Smirnov para cada dimensión

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
VI Gestión Contratación pública	,217	156	,000	,800	156	,000
Dimensión planificación	,239	156	,000	,873	156	,000
Dimensión Marco Normativo	,442	156	,000	,595	156	,000
Dimensión Proceso selección	,203	156	,000	,871	156	,000
Dimensión Ejecución contractual	,253	156	,000	,812	156	,000
Dimensión Tecnología	,376	156	,000	,711	156	,000
VD Cumplimiento de Obras	,288	156	,000	,806	156	,000
Dimensión Ejecución Contractual	,314	156	,000	,803	156	,000
Dimensión Garantías Adelanto	,206	156	,000	,868	156	,000
Dimensión Incumplimiento de contrato	,224	156	,000	,805	156	,000
Dimensión Culminación	,311	156	,000	,725	156	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Base de datos

Interpretación:

Dado que se cuenta con un total de 156 encuestas —superando las 50 observaciones— se optó por aplicar la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, descartando el uso de la prueba de Shapiro-Wilk, más apropiada para muestras pequeñas. El resultado arrojó un nivel de significancia de 0.000, el cual es menor al valor crítico de $p = 0.05$ ($\alpha = 0.05$). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula de normalidad y se acepta la hipótesis alternativa, lo que indica que las variables "gestión de contrataciones del estado" y "cumplimiento de obras" no presentan una distribución normal en la población estudiada.

Por lo tanto, para la contrastación de hipótesis se empleará el estadístico no paramétrico Rho de Spearman, adecuado para este tipo de distribución

5) Decisión y conclusión:

Por tanto, se rechaza H_0 y aceptamos la H_a , vale decir que los datos no poseen una distribución normal por tanto utilizaremos estadística no paramétrica. El estadístico en este caso es Rho de Spearman para determinar la relación entre las variables "gestión de contrataciones del estado" y "cumplimiento de obras" y sus dimensiones.

Tabla 15 *Tabla Coeficiente de correlación de Spearman*

Valor de rho	Significado
-1	Correlación negativo grande y perfecta
-0.9 a - 0.99	Correlación negativo grande muy alta
-0.7 a 0.89	Correlación negativo alta
-0.4 a 0.39	Correlación negativo moderada
-0.2 a 0.39	Correlación negativa baja
-0.01 a 0.19	Correlación negativa muy baja
0	Correlación nula
0.01 a 0.19	Correlación positiva muy baja
De 0,20 a 0,39	Correlación positiva baja
De 0,40 a 0,69	Correlación positiva moderada
De 0,70 a 0,89	Correlación positiva alta
De 0,9 a 0.9	Correlación positiva muy alta
1	Correlación positiva grande y perfecta

Fuente: Cielo.org.mx

4.3.1. Contrastación de Hipótesis

Hipótesis general

H1: $rv_{12} \neq 0$ La gestión de contrataciones del Estado se relaciona con el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

H0: $rv_{12} = 0$ La gestión de contrataciones del Estado no se relaciona con el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024

Segundo: El nivel de significancia

Para nuestra investigación el nivel de significancia $\alpha = 0.05$ con el cual se cotejará el p-valor de la prueba.

Tercero: Se calcula el valor de probabilidad más conocido como el p-valor

Calculamos el p-valor utilizando el software SPSS 26.

Tabla 16 *Correlación de las variables Gestión de contratación y cumplimiento de obras*

Correlaciones


			VI_ Gestión Contratación	VD Cumplimiento Obras
Rho de Spearman	VI_ Gestión Contratación	Coeficiente de correlación	1,000	,668**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	156	156
	VD Cumplimiento Obras	Coeficiente de correlación	,668**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	156	156

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

Se puede observar en la tabla que hay una correlación de 0.668 es decir 69% entre las variables gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos también la cumplimiento de obras, se demuestra que existe relación directa, y es significativa por que el p-valor encontrado de 0.000 comparando con el nivel de significancia para este estudio es de 0.05, encontramos que es menor, lo que determina rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Gráfico 13 *Correlación de gestión de contratación pública y cumplimiento de obras*

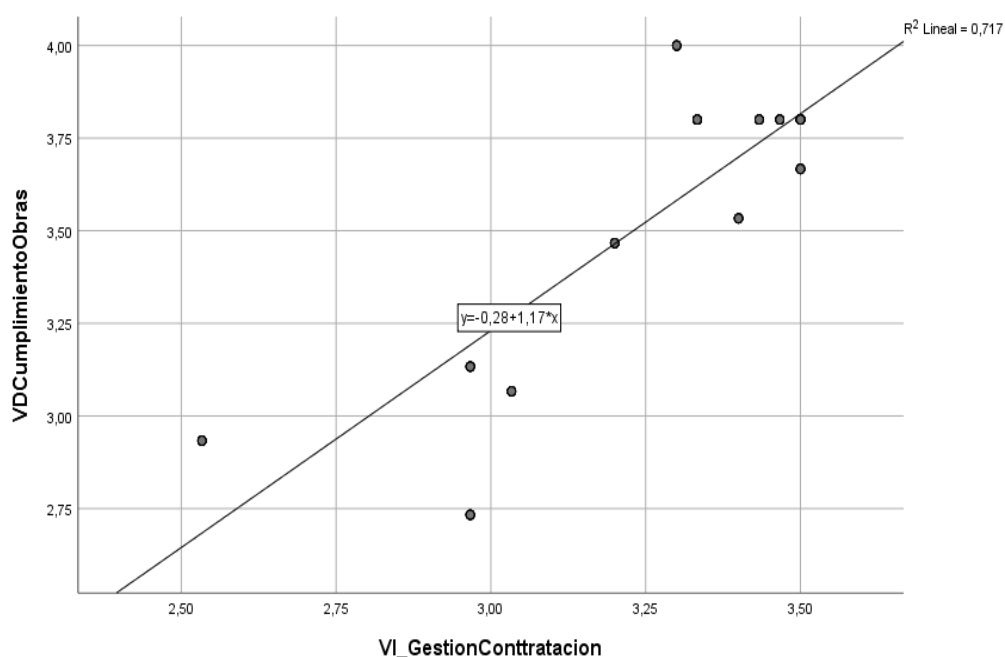

Cuarto: Decisión y Conclusión.

Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna.

Hay una correlación positiva moderada con un 69% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos el cumplimiento de obras en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

Hipótesis específico 1

H1: $rv_{12} \neq 0$ La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

H0: $rv_{12} = 0$ La variable gestión de contrataciones del estado no se relaciona con la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

Segundo: El nivel de significancia

Para nuestra investigación el nivel de significancia $\alpha = 0.05$ con el cual se cotejará el p-valor de la prueba.

Tercero: Se calcula el valor de probabilidad más conocido como el p-valor

Calculamos el p-valor utilizando el software SPSS 26.

Tabla 17 *Correlación de Gestión de contratación con la dimensión ejecución contractual*


			VI_ Gestión Contratación	Vd Ejecución Contractual
Rho de Spearman	VI_ Gestión Contratación	Coeficiente de correlación	1,000	-,179*
		Sig. (bilateral)	.	,025
		N	156	156
	Vd Ejecución Contractual	Coeficiente de correlación	-,179*	1,000
		Sig. (bilateral)	,025	.
		N	156	156

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

Se puede observar en la tabla la correlación es negativa de -0.179 es decir -18% entre las variables gestión de contrataciones del estado y la dimensión ejecución contractual, por lo que podemos afirmar que la variable gestión de ejecución contractual no está relacionado con la dimensión ejecución contractual, se demuestra que no existe relación directa, y no es significativa por que el p-valor encontrado de 0.025 comparando con el nivel de significancia para este estudio es de 0.05, encontramos que es menor, lo que determina rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Gráfico 14 Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión ejecución contractual

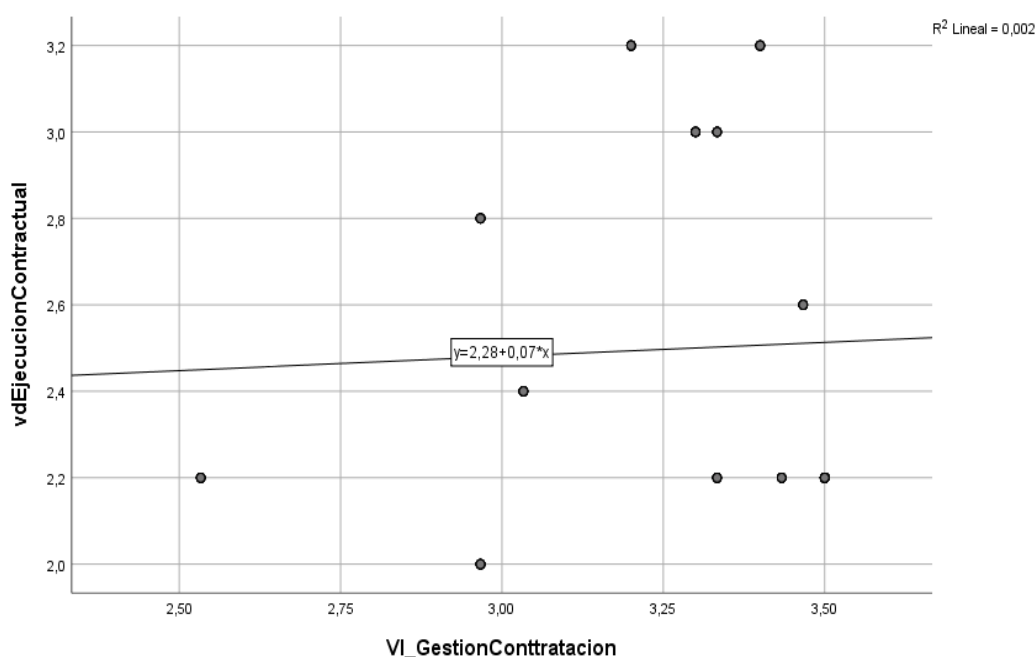

Cuarto: Decisión y Conclusión.

Concluimos que, no existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contratación pública y la ejecución contractual en la Región Pasco – 2024, permitiendo rechazar la hipótesis alterna.

No hay una correlación por cuanto con un -18% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual.

Hipótesis específica 2

H1: $r_{v12} \neq 0$ La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

H0: $r_{v12} = 0$ La variable gestión de contrataciones del estado no se relaciona con las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

Segundo: El nivel de significancia

Para nuestra investigación el nivel de significancia $\alpha = 0.05$ con el cual se cotejará el p-valor de la prueba.

Tercero: Se calcula el valor de probabilidad más conocido como el p-valor

Calculamos el p-valor utilizando el software SPSS 26.

Tabla 18 *Correlación de Gestión de contratación con la dimensión garantías de adelanto*


Correlaciones			VI_ Gestión Contratación	Vd Garantías Adelanto
Rho de Spearman	VI_ Gestión Contratación	Coeficiente de correlación	1,000	,563**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	156	156
	Vd Garantías Adelanto	Coeficiente de correlación	,563**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	156	156

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

Se puede observar en la tabla que hay una correlación de 0.563 es decir 56% entre las variables gestión de contratación pública y la dimensión garantías adelanto, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos también la garantía adelanto, se demuestra que existe relación directa, y es significativa por que el p-valor encontrado de 0.000 comparando con el nivel de significancia para este estudio es de 0.05, encontramos que es menor, lo que determina rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Gráfico 15 *Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión garantía de adelanto*

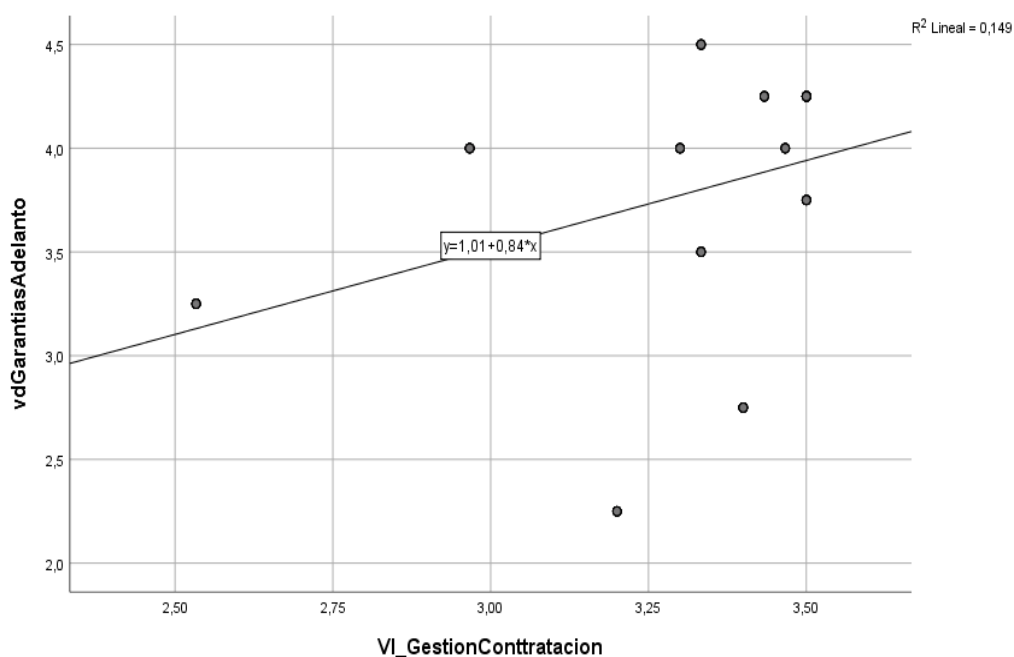

Fuente: Elaborado por el investigador

Cuarto: Decisión y Conclusión.

Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión garantías adelanto en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna.

Hay una correlación positiva moderada con un 56% entre la variable gestión de contratación pública y la dimensión garantías adelanto, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contratación pública entonces mejoraremos la dimensión garantías adelanto en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

Hipótesis específica 3

H1: $rv_{12} \neq 0$ La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

H0: $rv_{12} = 0$ La variable gestión de contrataciones del estado no se relaciona con el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

Segundo: El nivel de significancia

Para nuestra investigación el nivel de significancia $\alpha = 0.05$ con el cual se cotejará el p-valor de la prueba.

Tercero: Se calcula el valor de probabilidad más conocido como el p-valor

Calculamos el p-valor utilizando el software SPSS 26.

Tabla 19 *Correlación de Gestión de contratación con la dimensión incumplimiento de contrato*


Correlaciones			VI Gestión Contratación	Vd Incumplimiento Contrato
Tau_b de Kendall	VI Gestión Contratación	Coeficiente de correlación	1,000	,669**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	156	156
	Vd Incumplimiento de contrato	Coeficiente de correlación	,669**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	156	156

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

Se puede observar en la tabla que hay una correlación de 0.669 es decir 67% entre las variables gestión de contrataciones del estado y la dimensión el incumplimiento de contrato, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos también el incumplimiento de contrato, se demuestra que existe relación directa, y es significativa por que el p-valor encontrado de 0.000 comparando con el nivel de significancia para este estudio es de 0.05, encontramos que es menor, lo que determina rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Gráfico 16 *Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión incumplimiento de contrato*

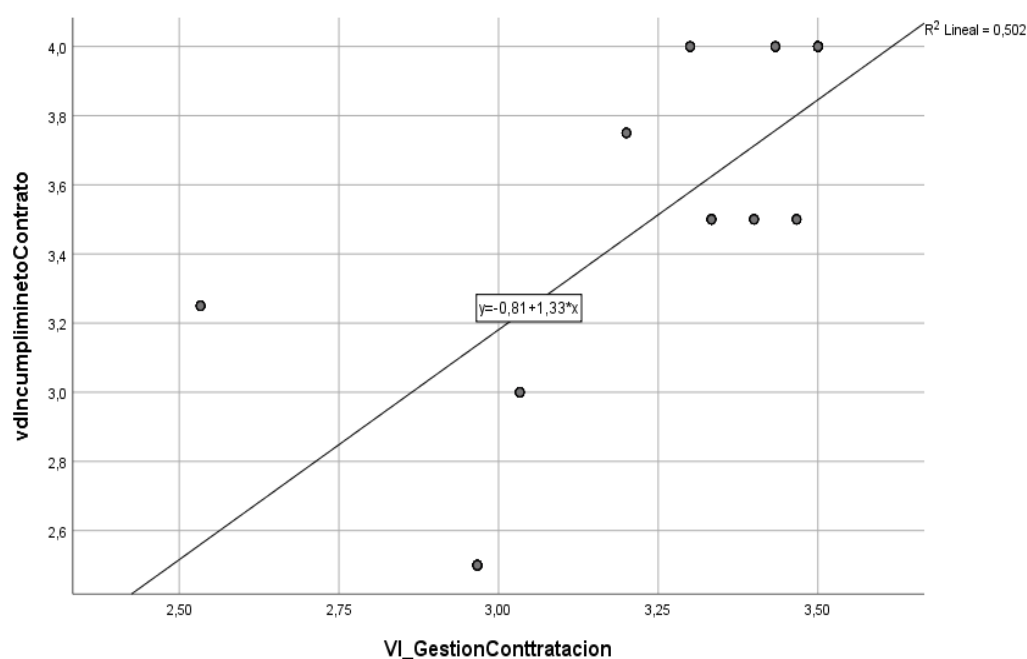

Fuente: Elaboración propia

Cuarto: Decisión y Conclusión.

Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contratación pública y la dimensión el incumplimiento de contrato en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna.

Hay una correlación positiva moderada con un 67% entre la variable gestión de contratación pública y la dimensión incumplimiento de obras, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contratación pública entonces mejoraremos el incumplimiento de contrato en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

Hipótesis específica 4

H1: $rv_{12} \neq 0$ La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con la culminación de la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

H0: $r_{12} = 0$ La variable gestión de contrataciones del estado no se relaciona con la culminación de la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024.

Segundo: El nivel de significancia

Para nuestra investigación el nivel de significancia $\alpha = 0.05$ con el cual se cotejará el p-valor de la prueba.

Tercero: Se calcula el valor de probabilidad más conocido como el p-valor

Calculamos el p-valor utilizando el software SPSS 26.

Tabla 20 *Correlación de Gestión de contratación con la dimensión culminación de contrato*


			VI_ Gestión Contratación	Vd Culminación
Rho de Spearman	VI_ Gestión Contratación	Coeficiente de correlación	1,000	,665**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	156	156
	Vd Culminación	Coeficiente de correlación	,665**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	156	156

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Cuestionario aplicado

Se puede observar en la tabla que hay una correlación de 0.665 es decir 67% entre las variables gestión de contratación pública y la dimensión la culminación de la ejecución contractual, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contratación pública entonces mejoraremos también la dimensión la culminación de la ejecución contractual, se demuestra que existe relación directa, y es significativa por que el p-valor encontrado de 0.000 comparando con el nivel de significancia para este estudio es de 0.05, encontramos que es menor, lo que determina rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Gráfico 17 *Correlación de gestión de contratación pública y la dimensión culminación de la ejecución contractual*

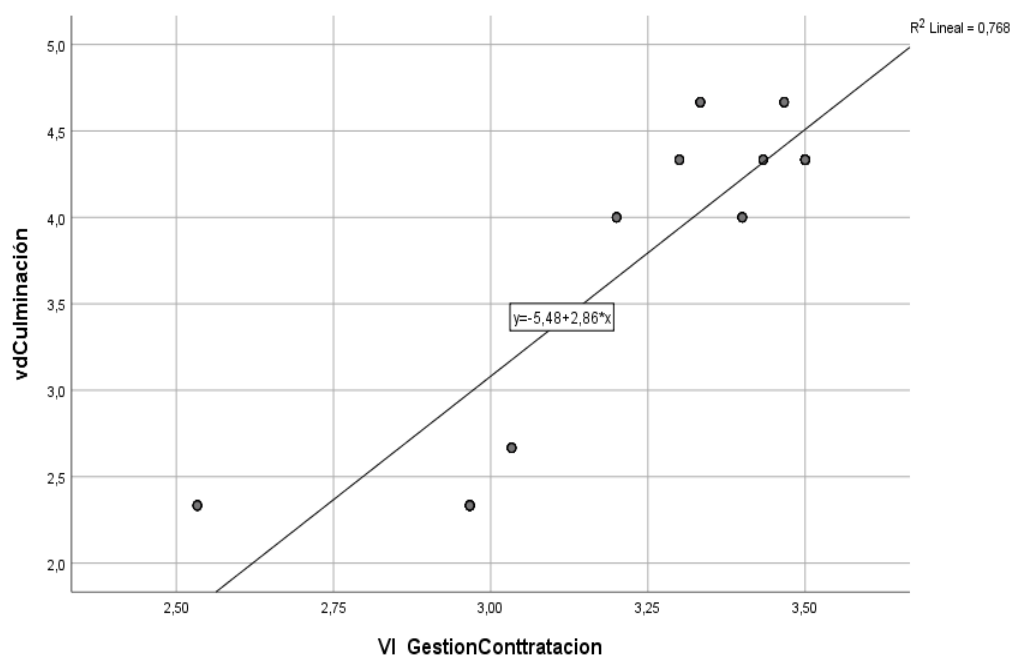

Fuente: Elaboración propia

Cuarto: Decisión y Conclusión.

Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de la ejecución contractual en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna.

Hay una correlación positiva moderada con un 67% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de la ejecución contractual, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos la culminación de la ejecución contractual en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

4.4. Discusión de resultados

Márquez, (2023) en el artículo científico intitulado Estudio del sistema de compras públicas en Chile: Evolución y perspectiva de compradores perteneciente a la Universidad de Chile maestría en gestión y políticas públicas llega a la siguiente

conclusión: “El levantamiento del sistema de compras y contrataciones públicas Chile (Chile-Compra) es una de las respuestas a la salida política de uno de Las crisis institucionales más importantes de la década de 2000, generadas por actos de corrupción por parte de altos funcionarios del sector de la construcción público. A pesar de un proyecto de ley que crea un mecanismo Se registraron ante la Cámara de Comercio 4.444 contrataciones públicas reguladas. Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contratación pública y la variable cumplimiento de obras en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna.

Hay una correlación positiva moderada con un 69% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos el cumplimiento de obras en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

Preciado et al., (2023) en la tesis intitulada Cultura de la corrupción en las contrataciones públicas entre empresas multinacionales y el estado colombiano en el periodo 2015-2023, de la Universidad Pontificia Bolivariana escuela de administración, economía y negocios internacionales de Medellín Colombia arribaron a la siguiente conclusión: “La cultura de la corrupción en Colombia está presente en las interacciones entre ellos. El Estado y el sector privado, especialmente en los contratos para la ejecución de 4.444 programas y/o proyectos, como lo demuestran los casos Odebrecht y REFICAR, en los que los sobornos y la falta de control provocaron al Estado colombiano pérdidas por varios millones de euros. Estas pérdidas para el Estado se reflejan en las pérdidas patrimoniales ocasionadas por casos como el de REFINE que los retrasos en este proyecto han causado esto. Concluimos que, no existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contratación

pública y la ejecución contractual en la Región Pasco – 2024, permitiendo rechazar la hipótesis alterna.

No hay una correlación por cuanto con un -18% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual.

Meyer & Fath, (2022) en la investigación intitulada Evaluación de las contrataciones públicas en Chile, en la revista científica reforma del estado volumen II, llega a las siguientes conclusiones: “El propósito de este estudio es estimular la discusión y el debate presentando impresiones y evaluaciones iniciales respecto de la reforma de la contratación pública. Creemos que esta evaluación puede contribuir al debate que se está desarrollando. La ley se ha acelerado desde la introducción de un proyecto de ley destinado a modernizar el sistema de compras públicas². Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contratación pública y la dimensión garantías adelanto en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna.

Hay una correlación positiva moderada con un 56% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión garantías adelanto, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos la dimensión garantías adelanto en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

Jayta & Rodriguez, (2024) tesis para obtener el grado académico de maestro intitulado Contrataciones públicas y obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa - periodo 2022-2023, de la Universidad Continental maestría en gerencia pública, llegó a las siguientes conclusiones: “Explicar la relación entre los puestos de administración directa y la transparencia en la municipalidad del distrito de Miraflores, Arequipa – periodo 2022-2023, se evidenció una relación significativa, ya que Rho y Rango de Spearman de

0,811 y nivel de significancia de $p = 0,000$; En este sentido, de acuerdo a lo expresado por los trabajadores que participaron en esta encuesta, La transparencia es un factor importante en la labor de la administración directa, desde Si no se proporciona o se proporciona incorrectamente, afecta el trabajo que realiza el municipio. Miraflores, Arequipa. Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contratación pública la culminación de la ejecución contractual en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna.

Hay una correlación positiva moderada con un 67% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de la ejecución contractual, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos la culminación de la ejecución contractual en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

CONCLUSIONES

1. Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna. Hay una correlación positiva moderada con un 69% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos el cumplimiento de obras en el gobierno Regional de Pasco – 2024.
2. Concluimos que, no existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual en la Región Pasco – 2024, permitiendo rechazar la hipótesis alterna. No hay una correlación por cuanto con un -18% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual.
3. Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión garantías adelanto en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna. Hay una correlación positiva moderada con un 56% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión garantías adelanto, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos la dimensión garantías adelanto en el gobierno Regional de Pasco – 2024.
4. Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión el incumplimiento de contrato en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna. Hay una correlación positiva moderada con un 67% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión incumplimiento de obras, por lo que podemos afirmar que si

mejoramos la variable gestión de contratación pública entonces mejoraremos el incumplimiento de contrato en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

5. Concluimos que, existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de la ejecución contractual en la Región Pasco – 2024, permitiendo afirmar y aceptar la hipótesis alterna. Hay una correlación positiva moderada con un 67% entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de la ejecución contractual, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la variable gestión de contrataciones del estado entonces mejoraremos la culminación de la ejecución contractual en el gobierno Regional de Pasco – 2024.

RECOMENDACIONES

1. Dado que existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la variable cumplimiento de obras en la en el gobierno de la Región Pasco, deben implementarse a las nuevas normas de contrataciones del estado como es la ley 32069.
2. En vista que no existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual en el gobierno Regional de Pasco no existe pertinencia en seguir alguna recomendación.
3. Toda vez que existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión garantías adelanto en el gobierno Regional de Pasco se recomienda tomar muy en cuenta al momento de celebrar contrato detallar la garantía de adelanto según la nueva normatividad.
4. Dado que existe suficientes evidencias empíricas que aprueban relacionar entre la variable gestión de contrataciones del estado y la dimensión el incumplimiento de contrato en el gobierno Regional de Pasco se recomienda a los funcionarios ser rigurosos al momento de elaborar y hacer cumplir el contrato de bienes o servicios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Antonio, M., & Zamora, M. (2022). Proveedores, Impedimentos y Tribunal de Contrataciones del Estado: Reflexiones sobre la posición del Tribunal de Contrataciones del Estado respecto de quien puede y quien no puede ser proveedor del Estado. *Derecho&Sociedad*, 45(4), 307–313.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/15248/15716>
- Ayala, M., Díaz, Y., Pérez, D., & Serrano, M. (2024). Obras públicas requeridas vs. obras públicas ejecutadas: Casuísticas de la región Caribe Colombia. In *Rev. Reflexiones* (Vol. 96, Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/rr.v96i2.32080>
- Becerra, M. (2020). El Tribunal de Contrataciones del Estado. *Derecho&Sociedad*, 44(2), 353–363.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/14417/15031>
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales* (Pearson, Ed.; Tercera ed).
- Briones, G. (2001). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. In A. E. e I. Ltda (Ed.), *Nature* (1ra Edició, Vol. 219, Issue 5160). <https://doi.org/10.1038/2191218a0>
- Bunge, M. (1999). *Las ciencias sociales en discusión. Una perspectiva filosófica* (Editorial sudamericana, Ed.; Impresa en Argentina). Editorial Sudamericana.
- Campos, A., Alarcón, A., Guzmán-Barrón, C., Latorre, D., Martínez, M., & Espinoza, S. (2022). Mesa Redonda: Luces y Sombras del Arbitraje en Contrataciones del Estado. *Derecho&Sociedad*, 44(2), 293–315.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/14413/150>

27

Campos, A., & BEdoya, N. (2024). Hacia la administración contractual colaborativa en la obra pública en el Perú: propuestas de aplicación. *Revista Derecho & Sociedad*, 4(55), 163–174.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/23240>

Casapino, M. A., Pellicer, E., Torres-Machi, C., & Ballesteros-Pérez, P. (2024). *Análisis de los procesos de licitación pública del sector de la construcción en el Perú*. http://dspace.aepro.com/xmlui/bitstream/handle/123456789/805/CIDIP2016_02027.pdf?sequence=1

Corbetta, P. (2012). *Metodología y técnicas de investigación social* (McGraw-Hill, Ed.; Primera ed.). <https://luisdoubbrontg.school.blog/wp-content/uploads/2021/04/corbetta-metodologia-y-tecnicas-de-investigacion-social.pdf>

De Alzola, P. (2024). Obras públicas en España. *Revista de Obras Públicas*, 4(2), 214–219. https://quickclick.es/rop/pdf/publico/1870/1870_tomoI_18_02.pdf

Entrena, D. B. (2024). Derecho a la ciudad, obras públicas locales y participación ciudadana. *Revista de Estudios de La Administración Local y Autonómica*, 94–108. <https://doi.org/10.24965/real.i17.11051>

Garay, E., Chavez, Y., & Atachao, J. (2023). Ejecución de obras públicas y gestión por resultados en un Gobierno Regional del Perú. *Revista Avanzada*, 2(1). <https://gestion.es.pe/index.php/revista>

Gorbaneff, Y., Gonzalez, J., & Barón, L. (2023). ¿Para qué sirve la interventoría de las obras públicas en Colombia. *Revista de Economía Institucional*, 13(24), 413–428.

- Gutierrez, H. (2023). *Contrataciones del estado y su influencia en el cumplimiento de obras públicas de una Municipalidad Provincial de La Libertad, año 2022* [Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/115514>
- Hernández, V. (2018). *Dimensiones teóricas sobre las políticas públicas*.
- Hernández-Sampieri, R., Hernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta edic). McGraw Hill.
- Jayta, E., & Rodriguez, D. (2024). *Contrataciones públicas y obras por administración directa en la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa - periodo 2022-2023* [Universidad Continental]. <https://hdl.handle.net/20.500.12394/15798>
- Ley N° 31535 modifica Ley 30225. (2022). *Ley 31535 Ley que modifica 30225 Ley de Contrataciones del Estado*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-la-ley-30225-ley-de-contrataciones-del-est-ley-n-31535-2090829-1>
- Mamani, L., & Barrientos, M. (2023). *Contrataciones del estado para adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 UIT, Municipalidad Distrital de Pisac, 2022* [Universidad Continental]. <https://hdl.handle.net/20.500.12394/9040>
- Marín, N., Correa, L., & Sotomayor, G. (2024). *Relación de la paralización de obras públicas y la crisis política*. <https://orcid.org/0000-0003-3423-1731>.
- Márquez, B. (2023). *Estudio del sistema de compras publicas en Chile: Evolución y perspectiva de compradores* [Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/184259>
- Meyer, D., & Fath, J. (2022). Evaluación de las contrataciones públicas en Chile. *Reforma Del Estado, II*, 1–62. https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/09/refor2_08_meyer.pdf

- Montenegro, F. (2022). *Gestión de contrataciones del Estado y proyectos de inversión pública de un gobierno regional, 2021* [Universidad César Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/80481>
- Núñez, M., & Talavera, A. (2021). *Contrataciones con el estado: Vol. I* (1ra ed.). Fondo Editorial Universidad del Pacífico. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21678/978-9972-57-479-5>
- Padua, J., Ahman, I., Apezechea, H., & Borsotti, C. (1979). *Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales: Vol. Primera edición*. Fondo de cultura económica.
- Pérez, E. (2022). *Contrataciones del Estado y ejecución presupuestal en la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Huallaga Central, Mariscal Cáceres-2022* [Universidad César Vallejo].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/96343>
- Preciado, M., Urrego, E., & Vallejo, M. (2023). *Cultura de la corrupción en las contrataciones públicas entre empresas multinacionales y el estado Colombiano en el periodo 2015-2023* [Universidad Pontificia Bolivariana].
<http://hdl.handle.net/20.500.11912/8582>
- Reglamento de la Ley N° 30225 Contrataciones del Estado. (2022). *Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado*. www.mef.gob.pe
- Revilla, A. (2021). La transparencia en la Ley de contrataciones del Estado. *Derecho PUCP*, 66, 195–221. <https://www.caeperu.com/colaboradores/Bryan-O.-Ramirez-Inga/pdf/transparencia-y-corrupcion-en-las-contrataciones-con-el-estado-revision-de-literatura.pdf>

- Salazar, D., & Angles, A. (2020). El diseño institucional de la corrupción: Vacíos regulatorios en contrataciones con el estado. In *Escuela de gobierno y políticas públicas*. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/126889>
- Soria, A. (2022). Temas de contratación con el Estado. Perspectiva jurídica. In *Temas de contratación con el Estado. Perspectiva jurídica: Vol. III*. Editorial UPC. <https://doi.org/10.19083/978-612-318-385-1>
- Taquire, I. (2023). *Ejecución de expedientes técnicos con deficiencias en la construcción de obras de infraestructura pública - Perú* [Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/42469>
- Valeriano, L. (2013). *Cómo optimizar la gestión pública del Perú* (Vol. 16). <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/download/8766/7610/30409>
- Villanueva, B. (2024). Contrataciones con el Estado. Obras Públicas en el Perú. *Derecho y Cambio Social*, i(61), 34–74. <https://www.derechoycambiosocial.com/>
- Zambrano, E. (2022). Algunos apuntes sobre la Fase de Actos Preparatorios en las Contrataciones del Estado. *Círculo de Derecho Administrativo* 2022, 2(4), 155–163. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/14018>
- Zelles, N. (2007). *Marco conceptual metodológico para el estudio de las políticas públicas*. Unidad de comuniucación institucional. www.sgp.gov.armayo2007

ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario



CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

PRESENTACIÓN

Reciba usted el saludo del día, mediante este cuestionario realizado en su institución laboral se busca analizar la gestión de contratación del estado. La honestidad en sus respuestas es lo más importante. La información recabada será solo con fines académicos.

II. INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y luego responda marcando con un aspa (x) la respuesta que considere aceptable.

SECCIÓN II: Test de opinión gestión de contrataciones del estado

Marque usted con un aspa (X) en cada pregunta su respuesta

1	2	3	4	5
Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indiferente	De acuerdo	Muy de acuerdo

Variable Independiente: Gestión de contratación pública	1	2	3	4	5
Dimensión: Planificación					
1. El cuadro de necesidades se está alineado a las necesidades requeridas por el área usuaria					
2. En el diseño del Plan Anual de Contrataciones se contempla el total de las necesidades de las áreas usuarias?					
3. Se promueve el cumplimiento de los procesos de acuerdo a la normatividad dentro de los plazos establecidos					
4. El comité de selección, tiene pleno dominio sobre la ley de contratación.					
5. Los Miembros del Comité de selección, están claramente notificados sobre la responsabilidad penal, civil y administrativa que pudieran imputarles.					
6. Las bases estandarizadas en los procesos de contratación, están alineados a lo establecido por la Ley N° 30225 de Contratación pública.					
7. Se da cumplimiento a la libre concurrencia en las bases de los procesos y procedimientos de la ley de contrataciones.					
8. Los expedientes de contratación de bienes y servicios se elaboran de acuerdo a la Ley N° 30225 de contrataciones del Estado.					
Dimensión: Marco normativo					
9. La mejora continua es un criterio que se aplica en la toma de decisiones de los operadores según los requerimientos de la contratación de bienes y servicios.					
10. En el Tribunal de OSCE aplican sanciones a proveedores cuando exceden los plazos establecidos por la Ley N° 30225.					
11. Se contemplan cláusulas en el contrato referente a anticorrupción para minimizar corrupción.					

12. Existe respeto a los parámetros legales al momento de efectuar el proceso de selección de servicios de consultoría de obras?					
13. El aprovisionamiento se realiza acorde a lo establecido en la Ley 30225 (LCE) su Reglamento.					
14. Se incentivan buenas prácticas con directivas relacionados a procedimientos legales.					
Dimensión: Proceso de selección					
15. Previamente se examinan las contrataciones de bienes y servicios.					
16. Existe un control adecuado a los plazos determinado para el sistema de registro de participantes a un proceso de selección.					
17. Los participantes en las convocatorias confían en la ejecución del procedimiento de selección.					
18. Los miembros del Comité de Selección, promueve el principio de libertad de concurrencia en la absolución de consultas y observaciones.					
19. Hay un respeto el los plazos establecido por la Ley N° 30225 de Contrataciones para dar inicio a los procedimientos contractuales después del consentimiento del SEACE.					
Dimensión: Ejecución contractual					
20. En el GOREPA el órgano encargado de las contrataciones promueve la suscripción del contrato dentro de los plazos establecidos.					
21. Siempre se solicitan los documentos sustentatorios para los pagos futuros de garantías.					
22. En el GOREPA siempre solicitan documentos sustentatorios para el futuro pago: Adelantos, adicionales y reducciones.					
23. En el GOREPA existe una rigurosa verificación antes de otorgar la conformidad del servicio, bienes y obras.					
24. Hay una preferencia o estandarización con visos de direccionamientos de un bien o servicio de un determinado bien o servicio.					
25. Hay un control en los plazos en los proveedores para realizar la ejecución contractual.					
Dimensión Tecnológica					
26. Se utiliza las herramientas informáticos y asesoría en la ejecución del proceso de selección.					
27. En el GOREPA se utilizan con frecuencia la comunicación electrónica.					
28. El uso de la informática es indispensable para el análisis estadístico y el seguimiento de procesos.					
29. Los responsables de contrataciones utilizan el correo electrónico para recibir y enviar información de los postores, como propuestas técnicas y económicas.					
30. En el desarrollo del proceso de selección es publicado en la Página Web del GOREPA					

Anexo 2: Cuestionario



CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS

PRESENTACIÓN

Reciba usted el saludo del día, mediante este cuestionario realizado en su institución laboral se busca analizar el cumplimiento de obras. La honestidad en sus respuestas es lo más importante. La información recabada será solo con fines académicos.

II. INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y luego responda marcando con un aspa (x) la respuesta que considere aceptable.

SECCIÓN II: Test de opinión gestión de contrataciones del estado

Marque usted con un aspa (X) en cada pregunta su respuesta

1	2	3	4	5
Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre

Variable Dependiente: Cumplimiento de obras	1	2	3	4	5
Dimensión: Ejecución contractual					
31. El GOREPA inicia oportunamente la ejecución de los contratos con los proveedores.					
32. El GOREPA normalmente paraliza la ejecución de los contratos con sus proveedores.					
33. El GOREPA identifica y reconoce los gastos y/o los costos de contingencia para facilitar la ejecución del contrato.					
34. En el GOREPA realiza contratos por ejercicios presupuestales mayores de 3 años.					
Dimensión: Garantías y adelanto					
35. El GOREPA facilita las prestaciones adicionales hasta un promedio de 25% de contrato original en la ejecución de obras civiles					
36. En el GOREPA se autoriza reducciones de hasta un 25% del monto contratado para la ejecución de obras civiles					
37. En el GOREPA ante cualquier controversia relacionada a la ampliación del plazo somete a arbitraje por un período de 30 días hábiles previa notificación.					
38. En el GOREPA se modifican los contratos cuando ocurre supervisión de terceros según lo establecido por la OSCE.					
Dimensión: Incumplimiento de contrato					
39. En el GOREPA se ejecuta penalidades por el incumplimiento de obligaciones contractuales determinados por los proveedores.					
40. El GOREPA implementa cálculos de penalidades diarias ante un retraso sin justificación en la entrega de obra.					

41. El GOREPA emite resolución por la paralización o reducción de las prestaciones por una inadecuada ejecución de las obras.					
42. Normalmente se notifica notarialmente la nulidad de servicio al contratista una vez vencido el plazo de incumplimiento de la obra.					
Dimensión: Culminación de la ejecución contractual					
43. En el GOREPA se supervisa y se verifica el cumplimiento de las condiciones mínimas contractuales antes de finalizar la ejecución de obras.					
44. En el GOREPA se comunica de manera oportuna las observaciones realizadas para subsanar en un plazo entre 2 y 8 días a los contratistas.					
45. En el GOREPA si existe retraso de pago con el contratista, se cumple con el pago de intereses legales.					

Anexo 3: Resultado del Baremo

Estadísticos

VI_GestionContrataciones		
N	Válido	156
	Perdidos	0
Mínimo		76.00
Máximo		105.00
Percentiles	30	96.0000
	70	104.0000

Estadísticos

vi_Planificación		
N	Válido	156
	Perdidos	0
Mínimo		20.00
Máximo		27.00
Percentiles	30	21.0000
	70	24.0000

Estadísticos

vi_MarcoNormativo		
N	Válido	156
	Perdidos	0
Mínimo		13.00
Máximo		18.00
Percentiles	30	17.0000
	70	17.0000

Estadísticos

VD_CumplimientoObras		
N	Válido	156
	Perdidos	0
Mínimo		41.00
Máximo		60.00
Percentiles	30	52.0000
	70	57.0000
Estadísticos		

vd_EjecuciónContractual

N	Válido	156
	Perdidos	0

Mínimo 10,00

Máximo 16,00

Percentiles 30 110,000

70 140,000

Estadísticos

vd_GarantíaAdelanto

N	Válido	156
	Perdidos	0

Mínimo 9,00

Máximo 18,00

Percentiles 30 140,000

70 170,000

Estadísticos

vd_IncumplimientoContrato

N	Válido	156
	Perdidos	0
Mínimo		10.00
Máximo		16.00
Percentiles	30	14.0000
	70	16.0000

Anexo 4: Validación de expertos

HOJA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO

I DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Mg. Erick Luis Solórzano Calisto

Grado académico: ~~Mg.~~ en Ciencias de la Administración - Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local

Nombre del instrumento de Evaluación: Cuestionario

Autor del instrumento: Katherine Estefany ESPINOZA MENDOZA

Título: "Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024"

II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-25%	Regular 26-50%	Buena 51-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. TÍTULO	Hace referencia al problema mencionado en las variables					92%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado					98%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables y objetivas					90%
3. ACTUALIDAD	Está acorde a los cambios en la administración moderna.					93%
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica					98%
5. SUFFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					97%
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para relacionar los aspectos del PEI y la gestión administrativa					93%
7. CONSISTENCIA	Basada en aspectos técnicos científicos y actualizados					91%
8. COHERENCIA	Entre los indicadores y las dimensiones					92%
10. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico.					97%
SUB TOTAL						91%
TOTAL (PROMEDIO)					91%	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

ES APLICABLE EL INSTRUMENTO

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 91%

Lugar y Fecha	DNI Nº	Firma del experto
Cerro de Pasco 18 de julio 2025	45475467	

HOJA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO

I DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Mg. Ángel Wilmer Huaynate Gonzales

Grado académico: Magister

Nombre del instrumento de Evaluación: Cuestionario

Autor del instrumento: Katherine Estefany ESPINOZA MENDOZA

Título: "Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024"

II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-25%	Regular 26-50%	Buena 51-65%	Muy Buena 66-80%	Excelente 81-100%
1. TÍTULO	Hace referencia al problema mencionado en las variables					92%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado					98%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables y objetivos					94%
3. ACTUALIDAD	Está acorde a los cambios en la administración moderna.					93%
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica					98%
5. SUFFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					97%
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos del PEI y la gestión administrativa					93%
7. CONSISTENCIA	Basada en aspectos técnicos científicos y actualizados					91%
8. COHERENCIA	Entre los indicadores y las dimensiones					92%
10. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico.					97%
SUB TOTAL						93%
TOTAL (PROMEDIO)						93%

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

ES APLICABLE EL INSTRUMENTO

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 93%

Lugar y Fecha	DNI NR	Firma del experto
Cerro de Pasco 10 de Julio 2025	40001045	

HOJA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO

I DATOS GENERALES

Apellidos y nombres del experto: Mg. Shirley Teresa Vargas Allende

Grado académico: ~~Mg.~~ en Ciencias de la Administración - Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local

Nombre del instrumento de Evaluación: Cuestionario

Autor del instrumento: Katherine Estefany ESPINOZA MENDOZA

Título: "Gestión de contrataciones del estado y su relación en el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco – 2024"



II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-25%	Regular 26-50%	Buena 51-65%	Muy Buena 66-80%	Excelente 81-100%
1. TÍTULO	Hace referencia al problema mencionado en las variables					92%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado					94%
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables y objetivos					90%
3. ACTUALIDAD	Está acorde a los cambios en la administración moderna.					93%
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica					94%
5. SUFFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					97%
6. INTENCIONALIDAD	Adecuada para valorar los aspectos del PEI y la gestión administrativa					93%
7. CONSISTENCIA	Basada en aspectos técnicos científicos y actualizados					91%
8. COHERENCIA	Entre los indicadores y las dimensiones					92%
10. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico.					97%
SUB TOTAL						85%
TOTAL (PROMEDIO)						85%

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

ES APLICABLE EL INSTRUMENTO

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 85%

Lugar y Fecha	DNI Nº	Firma del experto
Cerro de Pasco 25 de junio 2025	47814245	

Anexo 5: Base de datos 1

Variable Independiente: Gestión de contratación pública																															
Dimensión: Planificación								Dimensión: Marco normativo						Dimensión Tecnológica						Dimensión: Ejecución contractual						Dimensión Tecnológica					
vi.Plantificación 1	vi.Plantificación 2	vi.Plantificación 3	vi.Plantificación 4	vi.Plantificación 5	vi.Plantificación 6	vi.Plantificación 7	vi.Plantificación 8	vi.Marco.Norm ativo9	vi.Marco.Norm ativo10	vi.Marco.Norm ativo11	vi.Marco.Norm ativo12	vi.Marco.Norm ativo13	vi.Marco.Norm ativo14	vi.Proceso.Sele cción15	vi.Proceso.Sele cción16	vi.Proceso.Sele cción17	vi.Proceso.Sele cción18	vi.Proceso.Sele cción19	vi.Ejecución.Co ntratractua20	vi.Ejecución.Co ntratractua21	vi.Ejecución.Co ntratractua22	vi.Ejecución.Co ntratractua23	vi.Ejecución.Co ntratractua24	vi.Ejecución.Co ntratractua25	vi.Tecnológica2 6	vi.Tecnológica2 7	vi.Tecnológica2 8	vi.Tecnológica2 9	vi.Tecnológica3 0		
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	4	3	
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	4	3	
2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	5	3	
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4	4	
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4	4	
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4	4	
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4	4	
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4	4	
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2	2	
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2	2	
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	4	3	
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	4	3	
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	4	3	

2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3
2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3

2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3
2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3

2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3
2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3

2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3
2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	4	3
2	3	1	4	3	5	3	1	3	4	3	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	4	3	3	4	5	3	5	4	3

2	2	1	4	3	5	3	1	3	4	4	2	1	4	3	5	4	2	3	5	5	5	4	5	4	5	3	4	5	3
1	2	2	3	3	5	3	1	2	4	4	3	1	3	3	3	3	1	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	5	4
1	2	2	3	3	5	3	1	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	5	4	5	4	4	5	2	3	3	5	4
1	2	2	3	3	5	3	4	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	5	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	4
3	1	2	3	2	3	2	4	2	3	4	1	2	2	5	3	2	1	5	3	4	3	4	2	5	3	5	3	5	4
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
3	4	2	2	2	3	5	4	2	2	4	1	2	2	5	3	2	3	5	2	4	3	2	3	3	3	5	3	3	2
3	4	3	2	2	3	5	3	2	5	4	1	3	2	5	2	2	3	5	2	3	3	2	2	3	2	5	3	3	2
4	4	3	5	1	2	5	3	1	5	5	1	3	1	5	2	1	4	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3
2	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	2	1	4	4	5	4	2	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	3

Anexo 6: Base de datos 2

Variable Dependiente: Cumplimiento de obras														
Dimensión: Ejecución contractual				Dimensión: Garantías y adelanto				Dimensión: Culminación de la ejecución contractual						
vd.Ejecución Contractual31	vd.Ejecución Contractual32	vd.Ejecución Contractual33	vd.Ejecución Contractual34	vd.Garantías Adelanto35	vd.Garantías Adelanto36	vd.Garantías Adelanto37	vd.Garantías Adelanto38	vd.Incumplimiento Contrato39	vd.Incumplimiento Contrato40	vd.Incumplimiento Contrato41	vd.Incumplimiento Contrato42	vd.Culminación43	vd.Culminación44	vd.Culminación45
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4
5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4

5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4
5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4

5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4
5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4

5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4
5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4

5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4
5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	2	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	5	5	3	4	4	2	4	5	4	5
4	3	5	1	4	5	5	2	4	4	2	4	5	4	5
5	4	5	1	4	5	5	2	4	4	5	3	5	4	4
5	4	5	1	4	5	3	2	4	2	5	3	5	5	4

5	5	5	1	2	1	4	2	5	2	5	3	3	5	4
5	5	5	1	4	1	4	2	5	2	4	3	3	5	4
5	5	1	1	3	3	4	4	5	1	4	2	2	3	3
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
5	5	2	2	3	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	3	2	2	1	4	5	4	3	1	4	2	1	3	3
3	2	2	4	2	4	2	5	3	5	4	1	3	3	1
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5
4	1	3	3	5	4	5	3	4	5	3	4	4	4	5

Anexo 7: Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIÓN	INDICADORES	METODOLOGÍA	POBLACIÓN Y MUESTRA
Problema General: ¿Como es la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024?	Objetivo General: Establecer la relación entre la gestión de contrataciones del Estado y el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024.	Hipótesis Principal: La gestión de contrataciones del Estado se relaciona con el cumplimiento de obras públicas en el Gobierno Regional de Pasco 2024.	Variable 1: Gestión de contratación del estado	Planificación	X1 Cuadro de necesidades X2 Plan anual de contratación (PAC) X3 Comité de selección X4 Bases para procesos. X5 Expedientes de contratación.	ENFOQUE : Cuantitativo TIPO : Descriptivo - Correlacional MÉTODO: Se utiliza el método científico DISEÑO No Experimental, transversal correlacional	POBLACIÓN La población de estudio está conformada por 259 colaboradores del Gobierno Regional de Pasco de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) aprobado de acuerdo a la Ordenanza Regional No. 344-2014-G.R. PASCO/GR. MUESTRA La muestra en la presente
				Marco Normativo	X6 Bienes y servicios X7 Plazos estipulados X8 Aprovisionamiento según Ley reglamentos y directivas X9 Servicios de consultoría de obras		

				Proceso de selección	X10 Contrataciones Bs y Ss y obras X11 Registro de participantes X12 Respuestas a dudas de clientes. X13 Consultas y observaciones con SEACE.		investigación será de tipo probabilística 157 colaboradores del Gobierno Regional de Pasco Unidad de análisis. La Unidad de Análisis, está representado por 157 elementos.
				Ejecución contractual	X14 Contratos X15 Conformidad del servicio, bien y obras. X16 Estandarización de un bien o servicio. X17 Plazos de ejecución contractual.		
				Tecnológico	X18 Herramientas tecnológicas X19 Informática de análisis estadístico. X20 Uso de correo electrónico. X21 Página web institucional.		

Problemas específicos	Objetivos Específicos:	Hipótesis Secundaria			Y1 Plazos para la ejecución Y2 Vigencia contrata Y3 Nulidad de contrato		
PE1: a) ¿Cómo es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024? PE2: b) ¿Cuál es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024? PE3: c) ¿Cómo es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024? d) ¿Cómo es la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de ejecución	OE1: a) Determinar la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024. OE2: b) Establecer la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024. OE3: c) Determinar la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024. d) Determinar la relación entre la variable gestión de contrataciones del estado y la culminación de ejecución contractual en el Gobierno	HE1: a) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con la ejecución contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024. HE2: b) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con las garantías y adelanto en el Gobierno Regional de Pasco 2024. HE3: c) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con el incumplimiento de contrato en el Gobierno Regional de Pasco 2024. d) La variable gestión de contrataciones del estado se relaciona con la culminación de ejecución contractual en el	Variable 2: culminación obras públicas	Ejecución contractual			

contractual en el Gobierno Regional de Pasco 2024?	Regional de Pasco 2024.	Gobierno Regional de Pasco 2024.					
--	----------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

				Garantías y adelantos	Y4 Fiel cumplimiento Y5 Adelanto Y6 Cargo de la entidad Y7 Ejecución de garantía		
				Modificación del contrato	Y8 Adicionales y reducciones Y9 Ampliación de plazos Y10 Modificación de contrato		
				Incumplimiento de contrato	Y11 Penalidades. Y12 Causales de resolución. Y13 Efectos de resolución.		

				Culminación de ejecución contractual	Y14 Recepción. Y15 Conformidad del pago. Y16 Liquidación		
--	--	--	--	--	--	--	--

Anexo 8: Operacionalización de las variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Escala de medición
V.1. Gestión de contratación del estado	Se entiende por gestión de contratos el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el adecuado funcionamiento de la gestión de los contratos estatales y el uso del conocimiento. Asimismo, se refiere a las tareas y comprar suministros con uso de fondos o recursos Se han completado obras públicas obligatorio por contrato y oferta, y además compra o transferencia de productos (Martínez Zamora, 2022).	Se medirá mediante sus dimensiones: planificación, marco normativo, proceso de selección, ejecución contractual, tecnológico en una escala Likert a través de un cuestionario.	Planificación	Cuadro de necesidades	Ordinal
				Plan anual de contratación (PAC)	
				Comité de selección	
				Bases para procesos	
				Expediente para bienes	
				Expediente para servicios	
			Marco normativo	Bienes y Servicios	
				Plazos estipulados	
				Aprovisionamiento según ley reglamentos y directivas	
				Servicios de consultoría de obras	
			Proceso de selección	Contrataciones Bs y Ss y obras	
				Registro de participantes	
				Respuesta a dudas de los clientes	
				Consultas y observaciones con SEASE	
			Ejecución contractual	Contratos	
				Conformidad del servicio, bien y obra	

				Estandarización de un bien o servicio	
				Plazos de ejecución contractual	
			Tecnológico	Herramientas tecnológicas	
				Informática de análisis estadístico	
				Uso de correo electrónico	
				Página web institucional	
Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores	Escala de medición
V.2: Cumplimiento de obras públicas	Esta es la secuencia lógica de actividades constructivas que son fabricados en un periodo determinado ejecuciones; que incluye solo artículos de presupuesto del expediente técnico, y también enlaces posibles que pudiera presentarse. (Normas legales diario El Peruano 2022)	Se medirá mediante sus dimensiones ejecución contractual, garantías y adelantos, modificaciones del contrato, incumplimiento de contrato y culminación en una escala Likert a través de un cuestionario.	Ejecución contractual	Plazos para la ejecución	Ordinal
				Vigencia contrata	
				Nulidad de contrato	
			Garantías y adelantos	Fiel cumplimiento	
				Adelantos	
				Cargo de la entidad	
			Modificación del contrato	Ejecución de garantías	
				Adicionales y reducciones	
				Ampliación de plazos	
			Incumplimiento de contrato	Modificación de contrato	
				Penalidades	
				Causales de resolución	
			Culminación de ejecución contractual	Efectos de resolución	
				Recepción	
				Conformidad del pago	
				Liquidación	
